



**19/2018**

Teresina (PI), 20 de fevereiro de 2018.

Ao  
Ilmo. Srs.  
Membros do Comitê Gestor de Monitoramento - SUPARC

Nesta:

**Ref.: Relatório de Acompanhamento das Obras de Teresina - PI**


Prezados Senhores,

Segue impresso Relatório Técnico mensal de acompanhamento das obras do mês de Janeiro/2018 do Terminal Rodoviário de Teresina "Governador Lucídio Portella".

Certo de contarmos com vossa colaboração e compreensão de sempre, nos colocamos ao inteiro dispor e aproveitamos para renovar nossos protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

**Robson Silva**  
Coordenador de Operações - SINART  
Fone: (86) 3218-6146  
Celular: (86) 9.9827 1170  
[robson.silva@sinart.com.br](mailto:robson.silva@sinart.com.br)






# **RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS**

**TERMINAL RODOVIÁRIO DE TERESINA**

**REFORMA E MODERNIZAÇÃO**

**JAN/2018**





## Relatório de Acompanhamento

| Setor                               | Serviços executados                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Esquadrias de Alumínio              | <p>Continua o serviço de substituição das esquadrias antigas das lanchonetes e restaurantes do terminal rodoviário no pavimento superior.</p> <p>Concluído o assentamento da esquadria lateral da praça de alimentação no pavimento superior.</p> |
| Sanitário da Plataforma de Embarque | <p><b>Serviços CONCLUÍDOS.</b></p> <p>Em fase de revisão de check list.</p>                                                                                                                                                                       |
| Reservatório Elevado                | <p>Iniciado o processo de solicitação da ligação de água do reservatório através da empresa águas de Teresina.</p>                                                                                                                                |



|                                              |                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Praça de Alimentação</p> <p>ETAPA III</p> | <p>Iniciado os serviços de demolições e retirada de esquadrias.</p> <p>Iniciado os serviços de alvenaria da mureta para recebimento da esquadria nova.</p>                                       |
| <p>Impermeabilização</p>                     | <p>Continua o serviço de impermeabilização de pétalas do teto do terminal pela empresa J.F. Cunha.</p> <p>CONCLUÍDO os serviços de impermeabilização a serem executados pela empresa KALFIX.</p> |
| <p>Lanchonetes</p> <p>ETAPA II</p>           | <p>Concluída a transferência dos permissionários para início da ETAPA III.</p>                                                                                                                   |
| <p>Guichês de Atendimento</p>                | <p><b>Serviços CONCLUÍDOS.</b></p> <p>Em fase de revisão de check list.</p>                                                                                                                      |

**Serviços CONCLUÍDOS.**

Estacionamento

Aguardando peça para de acabamento na lateral das telhas.

Shafts

Contratada a empresa para execução do reforço estrutural em vigas metálicas.

Projeto contra  
Incêndio


Iniciado os serviços civis do projeto contra incêndio do terminal.

Recebido material para execução das tubulações.

Cabeamento  
Estruturado

Iniciado a instalação da eletro calhas.

**CONCLUÍDO** os serviços de construção da casa do DG e datacenter do cabeamento estruturado.



|                      |                                                                                                                                       |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Domus da Cobertura   | Em fase de contratação da empresa para executar a substituição dos DOMUS do teto do terminal em acrílico para DOMUS em policarbonato. |
| Deposito de Lixo     | Iniciado os serviços de construção do Deposito de Lixo do Terminal Rodoviário.                                                        |
| Variedades Etapa III | Iniciado os serviços de Demolição para construção das variedades ETAPA III                                                            |




|                    |
|--------------------|
| RECEBIDO           |
| Em <u>21/08/18</u> |
| <u>Borba</u>       |
| SUPARC/SEADPREV    |



## RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

OBRA: Ref. e modernização do terminal rodoviário de Teresina

### SERVIÇOS EXECUTADOS



Instalações das Esquadrias.



Sanitário da Plataforma de Embarque.



Praça de Alimentação.



RECEBIDO  
Em 20/02/08  
Borda  
SUPARC/SEADPREV



Lanchonetes 03/04/05 e 06.




Reservatório Elevado.



Guichês de Atendimento.



Impermeabilização pétalas do teto.

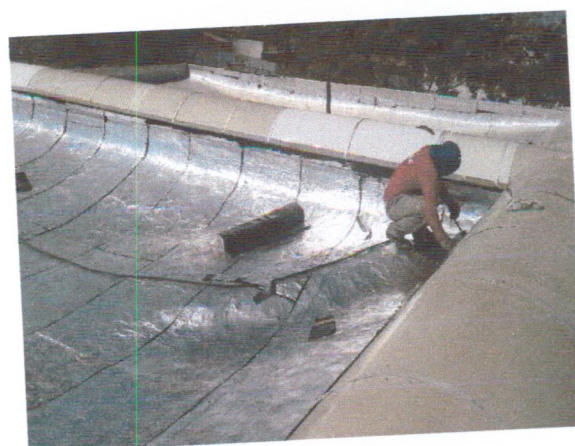

Cobertura da Guarita.




|              |
|--------------|
| RECEBI       |
| Em 26/02/16  |
| Ronda        |
| SUPARC/SEADP |




**Casa de Gás.**



**Casa de DG.**

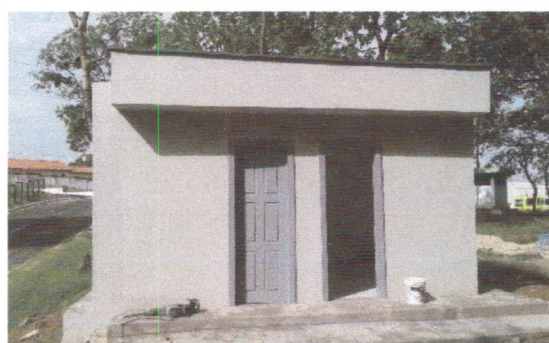

**Cabeamento Estruturado**

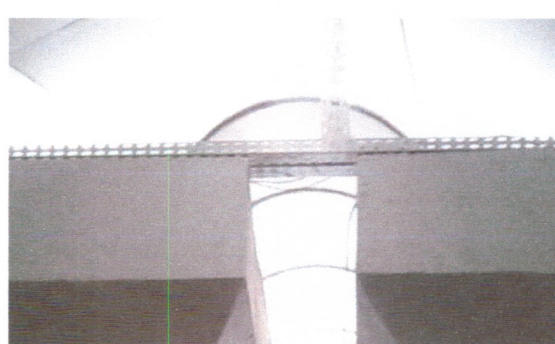

**Variedades ETAPA III**

**Celso Costa**  
**Coord. de Manutenção/SINART-PI**  
**Terminal Rod. Teresina**  
 (86) 9.9962-4695 watts  
 (86) 9.9962-4695

**Celso Sousa**  
 Coordenador de Manutenção  
 SINART - RODOVIÁRIAS

**Robson Silva**  
 Coordenador de Operações  
 SINART - RODOVIÁRIAS

|                 |          |
|-----------------|----------|
| <b>RECEBIDO</b> |          |
| Em              | 21/02/18 |
| [Signature]     |          |
| SUPARC/SEADPREV |          |

## FOLHA DE INFORMAÇÃO OU DESPACHO

|         |        |
|---------|--------|
| Rubrica | Fls nº |
| Anexos  | Número |

Ao Comitê de Monitoramento,

De ordem, para conhecimento e providencias cabíveis.

Teresina, 21/02/18.

  
**Simone Borba Soares**  
Gerente de Acomp. de Projetos  
SUPARC/SEAD



PARCERIA  
PÚBLICO  
PRIVADA



## FOLHA DE INFORMAÇÃO OU DESPACHO

|         |        |
|---------|--------|
| Rubrica | Fls nº |
| Anexos  | Número |

Teresina (PI), 22 de Fevereiro de 2018.

Ao Apoio Técnico,

Ref.: Referente ao Comunicado 19/2018 SINART – Relatório de Acompanhamento das Obras de Teresina

Em consonância com o despacho de ordem, encaminhar o documento acima referenciado para os membros do Comitê de Monitoramento, e FGV (via *email* membros SUPARC, via formal e *email* para FGV) para conhecimento.

Após a demanda, para devida instrução processual, juntar o documento ao processo TR Teresina.

Atenciosamente,

Lidiane C. Oliveira

Comitê de Monitoramento - CMO

Superintendência de Parcerias e Concessões – SUPARC
