



RELATÓRIO GERAL DE ACOMPANHAMENTO

DAS OBRAS

TERMINAL RODOVIÁRIO DE TERESINA

REFORMA E MODERNIZAÇÃO

AGO/2017



OBRAS EXECUTADAS

Setor	Serviços executados
Área Externa	Requalificação das áreas dos jardins contíguos à entrada principal, Serviço de sinalização vertical da entrada do terminal rodoviário, bem como os serviços de limpeza e pintura dos pilares.
Escadas Rolantes	Inauguradas no dia 18 de outubro, com a presença do Secretário de Administração, da Superintendente da SUPARC e membros do comitê de fiscalização.
Drenagem da Cobertura	Concluída a desobstrução dos dutos de drenagem localizados no interior de 12 pilares que conduzem a água de chuva captada pelas cúpulas de concreto da cobertura.
Poço Tubular	Confecção de cerca de proteção, instalação de sistema de controle potabilidade, proteção da base do poço e assentamento do portão para controle de acesso a área do poço tubular do terminal.

Reforma do Subsolo	Obra de construção da área institucional no subsolo do terminal, para instalação de órgãos do governo do estado.
Estacionamento	Concluído os serviços de reforma do estacionamento, incluindo instalação de gradil de proteção no entorno da área e cancelas automatizadas.
Rampas de Acesso	Instalação dos corrimãos de inox nas 04 (quatro) rampas de acesso do terminal rodoviário.
Sanitário masculino/feminino (Pavimento Térreo)	Concluído os serviços de reforma e modernização do sanitário masculino e feminino no pavimento térreo.
Sanitário masculino/feminino (Pavimento Superior)	Concluído os serviços de reforma e modernização do sanitário masculino e feminino no pavimento superior.
Praça de Alimentação (Etapa 01)	Concluída primeira etapa das obras da praça de alimentação composta de 02 restaurantes, 02 lanchonetes, 10 variedades e cerca de 30% da área comum da praça.



OBRAS EM EXECUÇÃO

Setor	Serviços em execução
Impermeabilização	Em execução a recuperação e impermeabilização de todas as pétalas do teto do Terminal rodoviário, serviços iniciados no mês de Agosto com previsão de término em Novembro de 2017.
Sanitário Plataforma	Iniciado os serviços para construção do sanitário masculino e feminino no setor de embarque do terminal rodoviário, iniciado em Agosto e previsão de conclusão dos serviços em Outubro 2017.
Instalação Elevador	Em fase de conclusão dos serviços referentes a instalação do elevador.
Junta de Dilatação	Iniciado os serviços de limpeza mecânica das juntas com retirada completa dos restos da selagem antiga e reposição de selagem das juntas de dilatação, com previsão de conclusão em Setembro de 2017.
Guichês de Venda de Passagens	Concluído os serviços de construção de guichês provisórios, para início da construção dos novos guichês de venda de passagens no pavimento térreo.
Praça de Alimentação (Etapa 02)	Iniciado os serviços de construção e modernização da praça de alimentação com previsão de conclusão dos serviços em Dezembro de 2017.



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

OBRA: Ref. e modernização do terminal rodoviário de Teresina

SERVIÇOS EXECUTADOS



Área Externa (Jardins Externos)



Área Externa (Sinalização da entrada terminal).



Área Externa (Pintura dos Pilares Entrada).





Inauguração das escadas rolantes.



Drenagem da Cobertura.



Proteção e Controle de potabilidade do Poço.



Área Institucional.





Estacionamento (Inst. Cancelas)




Estacionamento (Inst. Gradil)



Reservatório Elevado.



Instalação de Corrimão.

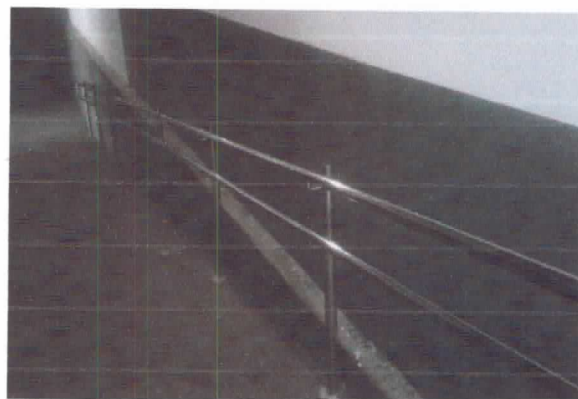



Instalação de Corrimão.



Sanitário (Pav. Térreo).



Sanitário (Pav. Térreo).



Sanitário (Pav. Superior).





Sanitário (Pav. Superior).



Praça de Alimentação.



Praça de Alimentação.





RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

OBRA: Ref. e modernização do terminal rodoviário de Teresina

SERVIÇOS EM EXECUÇÃO



Impermeabilização



Sanitário Plataforma Embarque





Instalação Elevador.



Junta Dilatação.



Praça de Alimentação.



Praça de Alimentação.



	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Sep	Out	Nov	Dez
1. REVISÃO GERAL: PERMISSÃO DE OBRA												
2. ADAPTAÇÃO COM PERMISSÃO DE OBRA												
3. SANITÁRIOS												
3.1. SANITÁRIO SUPERIOR FEMININO												
3.2. SANITÁRIO SUPERIOR MASCULINO												
3.3. SANITÁRIO TABACADO INTERIO												
3.4. SANITÁRIO FUNCIONÁRIOS												
4. ÁREAS INSTITUCIONAIS												
5. OBRAS DA COBERTURA												
5.1. DESOBSTRUÇÃO DE CHUVEIROS												
5.2. INSTALAÇÃO DE RAIOS												
5.3. TUBOS / DRENOS DE CHUVA												
5.4. AJUSTES DO PROJETO DE DRENAGEM												
6. ESTACIONAMENTO												
6.1. INSTALAÇÃO DO GRUPO												
6.2. RECONSTRUÇÃO DE MURO DE												
6.3. RECONSTRUÇÃO DA TORRE DE												
6.4. RECONSTRUÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL												
7. REQUALIFICAÇÃO DO PAV. SUPERIOR												
7.1. REQUALIFICAÇÃO DOS PERMISSÓRIOS												
7.2. REQUALIFICAÇÃO DAS OBRAS												
8. REQUALIFICAÇÃO DO PAV. INFERIOR												
8.1. REQUALIFICAÇÃO DOS PERMISSÓRIOS												
8.2. REQUALIFICAÇÃO DOS TRANSFORMADORES /												
8.3. REQUALIFICAÇÃO DO GRUPO												
8.4. REQUALIFICAÇÃO DA TORRE DE												
9. APROVAÇÃO PROJETO INSTALAÇÕES												
9.1. APROVAÇÃO PROJETO DE COMBATE A												
9.2. APROVAÇÃO PROJETO DE COMBATE A												
10. SUBESTAÇÃO / GRUPO GERADOR												
10.1. COMBATE A INCÊNDIO												
10.2. CANAL DE ENTRADA												
10.3. INSTALAÇÃO DE NOVO MEDIDOR												
10.4. INSTALAÇÃO DE NOVA ILUMINAÇÃO												
10.5. INSTALAÇÃO DE NOVA												
11. ELÉTRICOS												
11.1. ELÉTRICO												
11.2. ABERTURA DA LAJE / FORRO												
11.3. COBERTURA DA TORRE / ALIMENTAÇÃO												
11.4. INSTALAÇÃO DA CABINE												
12. TESTES												
13. ESCADAS												
13.1. ESCADAS PLANTAS												
13.2. ESCADAS NOVAS												
13.3. CAMINHOS ESCADAS VELHAS E NOVAS												
13.4. PROJETO E EXECUÇÃO APOIOS												
13.5. RECONSTRUÇÃO LATERAL INOX												
13.6. ENFEREIRA E INSTALAÇÃO ELÉTRICA												
13.7. TESTES												
13.8. ESCADA CENTRAL												
13.9. ESCADA CENTRAL												
14. RESERVATÓRIOS / REDE DE												
14.1. ABASTECIMENTO DE ÁGUA												
14.2. COBERTURA DO NOVO RESERVATÓRIO												
14.3. REDE DE TUBOS DE ABASTECIMENTO DE												
14.4. ÁGUA												
14.5. PLANTA DOS RESERVATÓRIOS ANTIGOS												
15. ESTRUTURA / COBERTURA												
15.1. REVISÃO DAS FUNDAMENTAÇÕES												
15.2. REQUALIFICAÇÃO ESTRUTURAL												
15.3. SUBSTITUIÇÃO DOS DOIS												
15.4. RECONSTRUÇÃO												
16. REQUALIFICAÇÃO DA ESTRUTURA E												
16.1. REQUALIFICAÇÃO DA ESTRUTURA												
16.2. REQUALIFICAÇÃO DA FACHADA / BRISAS												
17. SHIT												

Celso Costa
 Coord. de Manutenção/SINART-PI
 Terminal Rod. Teresina
 (86) 9.9962-4695 watts
 (86) 9.9962-4695
