



115/2017

Teresina (PI), 10 de novembro de 2017.

Ao
Ilmo. Srs.
Membros do Comitê Gestor de Monitoramento - SUPARC

Nesta:

Ref.: **Relatório de Acompanhamento das Obras de Teresina - PI**


Prezados Senhores,

Segue impresso Relatório Técnico mensal de acompanhamento das obras do mês de agosto/2017 do Terminal Rodoviário de Teresina "Governador Lucídio Portella".

Certo de contarmos com vossa colaboração e compreensão de sempre, nos colocamos ao inteiro dispor e aproveitamos para renovar nossos protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

Robson Silva
Coordenador de Operações - SINART
Fone: (86) 3218-6146
Celular: (86) 9.9827 1170
robson.silva@sinart.com.br





RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS

TERMINAL RODOVIÁRIO DE TERESINA

REFORMA E MODERNIZAÇÃO

AGO/2017



Relatório de Acompanhamento

Setor	Serviços executados
Instalação do elevador	Em fase de conclusão o serviço de revestimento da cabine do elevador em alumínio composto e vidro temperado. Recebido a cabine do elevador.
Restaurantes Pav. Superior	Concluída a instalação de treliças metálicas para fixação de porta de enrolar e letreiro. Concluída o assentamento de portas de enrolar na entrada principal. Iniciado serviço de pinturas nas portas de enrolar.
Sanitário da Plataforma de Embarque	Concluído o tapume de madeirite para isolamento da área a ser construído o sanitário. Concluído os serviços de escavação de valas para início do baldrame. Concluído o serviço de confecção de baldrame. Iniciado o serviço de alvenaria em bloco cerâmico.

Reservatório Elevado	Concluída instalação do reservatório elevado. Iniciado processo de troca de ganchos de fixação por conta de emenda nos mesmos.
Estacionamento	Iniciado os serviços de instalação de placas da sinalização vertical e serviço de pintura da sinalização horizontal. Iniciado os serviços de instalação das câmeras de monitoramento.
Praça de Alimentação	Concluído a recuperação do piso da área correspondente a primeira etapa de inauguração. Iniciado os serviços de instalação das esquadrias de alumínio e vidro do mirante.
Impermeabilização	Continua o serviço de impermeabilização de pétalas do teto do terminal rodoviário.
Sanitário masc./fem. Pavimento Superior.	Concluído todos os serviços no sanitário feminino. Concluído todos os serviços do sanitário masculino. Previsão de inauguração em: 01/09.
Lanchonetes	Concluído todos os serviços de construção das duas primeiras lanchonetes.



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

OBRA: Ref. e modernização do terminal rodoviário de Teresina

SERVIÇOS EXECUTADOS



Instalação do elevador.



Restaurante Pav. Superior.



Sanitário Pav. Térreo.





Sanitário Pav. Superior.



Estacionamento.



Praça de Alimentação.




Lanchonetes.






Reservatório Elevado.



Impermeabilização pétalas do teto.

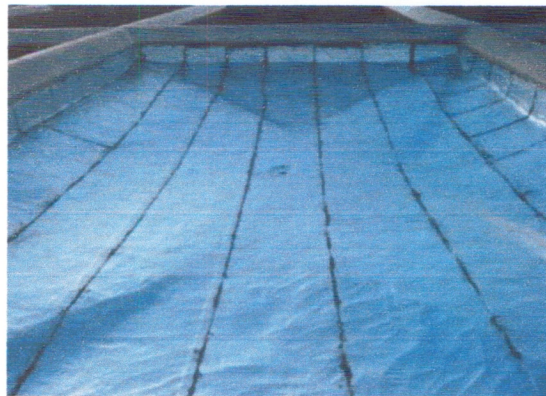


Sanitário da Plataforma de Embarque




Celso Costa

Coord. de Manutenção/SINART-PI
Terminal Rod. Teresina
(86) 9.9962-4695 watts
(86) 9.9962-4695


Celso Sousa
Coordenador de Manutenção
SINART - RODOVIÁRIAS

