




RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS

TERMINAL RODOVIÁRIO DE TERESINA

REFORMA E MODERNIZAÇÃO

FEV/2017





Relatório de Acompanhamento

Setor	Serviços executados
Poço Tubular	Concluído os serviços de confecção de cerca de proteção e assentamento do portão para controle de acesso a área do poço tubular do terminal.
Guichês Provisórios	Concluído a montagem de 02 guichês provisórios para transferência de permissionários e liberação da área para locação e execução dos serviços de instalação do elevador.
Restaurantes Pav. Superior	Iniciado e concluído os serviços de isolamento de parte da área do restaurante para transferência de permissionário e início dos serviços de demolições.
Instalação do elevador	Iniciado os serviços de isolamento da área com tapumes de madeirite para liberação dos serviços de instalações do elevador.

Sanitário masc. Pavimento Térreo.	Continuam os serviços de recuperação da laje seguindo as orientações da empresa especializada, porém por se tratar de um método de execução quase artesanal os serviços só deverão ser concluídos no mês de Maio.
Variedades Pav. Superior	Iniciado e concluído os serviços de isolamento com tapumes da área para início dos serviços de alvenaria.
Reservatório Elevado	Encontra-se em fase de elaboração pela empresa contratada o projeto da base do reservatório elevado para a instalação do mesmo.




RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

OBRA: Ref. e modernização do terminal rodoviário de Teresina


SERVIÇOS EXECUTADOS



Proteção do poço tubular.

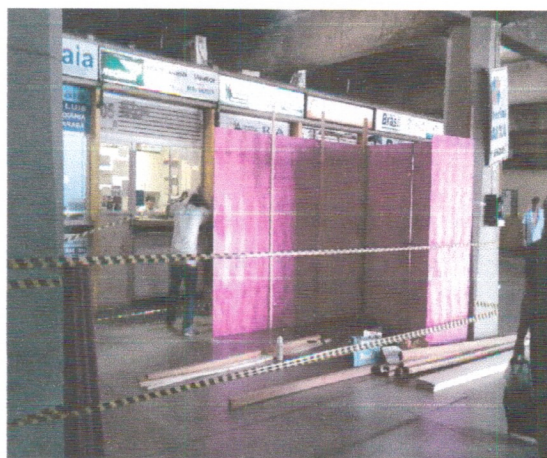

Instalação de guichês Provisórios.

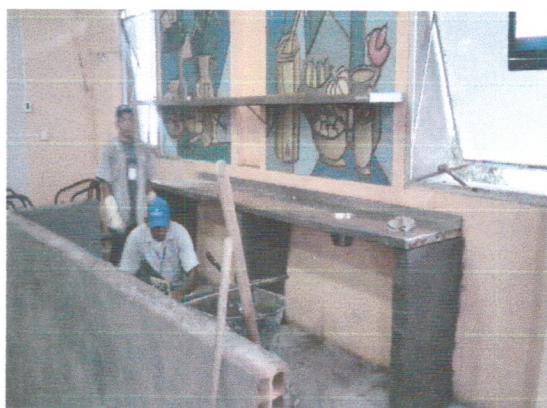

Restaurante Pav. Superior





Recuperação Laje Sanitário.



Isolamento da área do elevador.



Variedades.




Celso Costa

Coord. de Manutenção/SINART-PI
Terminal Rod. Teresina
(86) 9.9962-4695 watts
(86) 9.9962-4695


Celso Sousa
Coordenador de Manutenção
SINART - RODOVIÁRIAS
