



080/2017

Teresina (PI), 14 de Junho de 2017.

Ao

Ilmo. Srs.

Membros do Comitê Gestor de Monitoramento - SUPARC

Nesta:

Ref.: **Relatório de Acompanhamento das Obras de Teresina - PI**

Prezados Senhores,

Segue impresso Relatório Técnico mensal de acompanhamento das obras do mês de Junho/2017 do Terminal Rodoviário de Teresina "Governador Lucídio Portella".

Certo de contarmos com vossa colaboração e compreensão de sempre, nos colocamos ao inteiro dispor e aproveitamos para renovar nossos protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

Robson Silva


Coordenador de Operações - SINART

Fone: (86) 3218-6146

Celular: (86) 97281170

robson.silva@sinart.com.br

Robson Silva
Coordenador de Operações
SINART - RODOVIÁRIAS





RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS

TERMINAL RODOVIÁRIO DE TERESINA

REFORMA E MODERNIZAÇÃO

JUN/2017



Relatório de Acompanhamento

Setor	Serviços executados
Instalação do elevador	Aguardando chegada da cabine do elevador após conclusão dos serviços de montagem da torre.
Restaurantes Pav. Superior	Concluído os serviços de contrapiso e instalações elétricas. Iniciado os serviços de assentamento de piso e pintura.
Sanitário masc./fem. Pavimento Térreo.	Concluído os serviços de assentamento de piso de porcelanato e revestimento de porcelanato em parede. Concluído os serviços de assentamento de bancadas e divisórias de granito.

Reservatório Elevado	Em fase de conclusão os serviços de confecção da base para recebimento do reservatório.
Estacionamento	Concluído os serviços de reforma da área do estacionamento. Em fase contratual os serviços de sinalização horizontal e vertical. Em fase de conclusão a instalação das cancelas automatizadas.
Rampas de Acesso	Concluído os serviços de instalação dos corrimãos de inox em todas as rampas do terminal.
Impermeabilização	Continua o serviço de impermeabilização de pétalas do teto do terminal rodoviário.
Sanitário masc./fem. Pavimento Superior.	Concluído os serviços de assentamento de piso de porcelanato e revestimento de porcelanato em parede. Concluído os serviços de assentamento de divisórias de granito.
Medidores Individuais	Concluído serviço de instalação dos medidores no pavimento térreo e pavimento superior para individualização provisória do consumo de energia elétrica dos locatários.



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

OBRA: Ref. e modernização do terminal rodoviário de Teresina

SERVIÇOS EXECUTADOS



Instalação do elevador.




Restaurante Pav. Superior.




Sanitário Pav. Térreo.




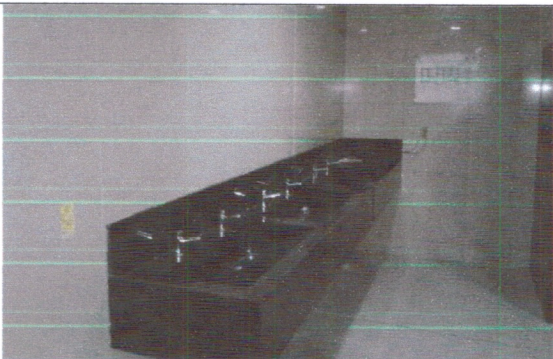



Sanitário Pav. Superior.

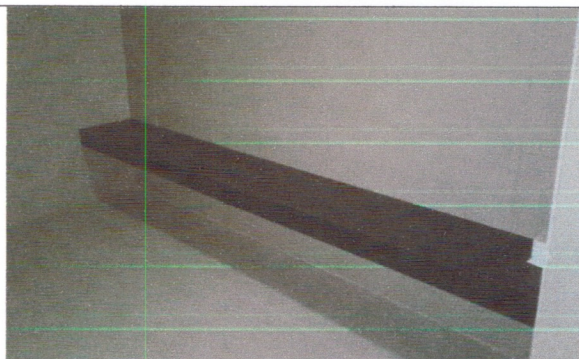

Estacionamento.

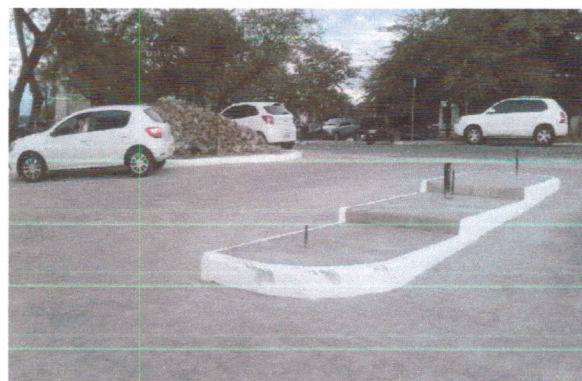

Rampas de Acesso.

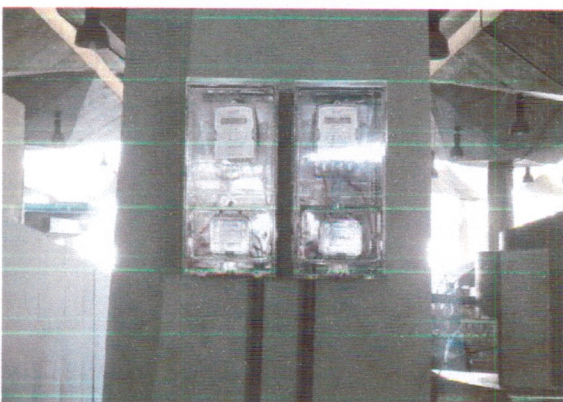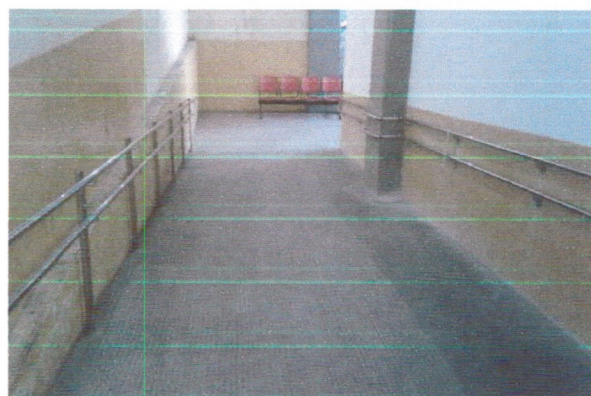


Medidores Individuais.




[Handwritten signature]



Reservatório Elevado.

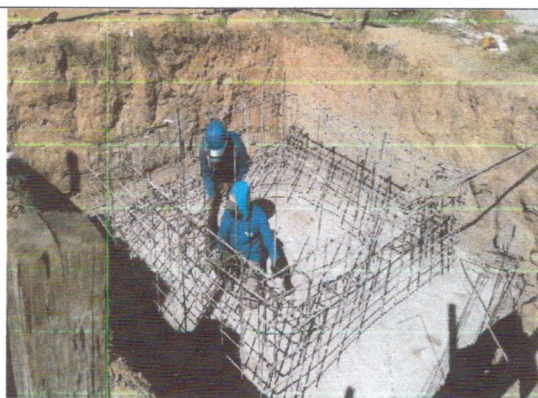

Impermeabilização pétalas do teto.

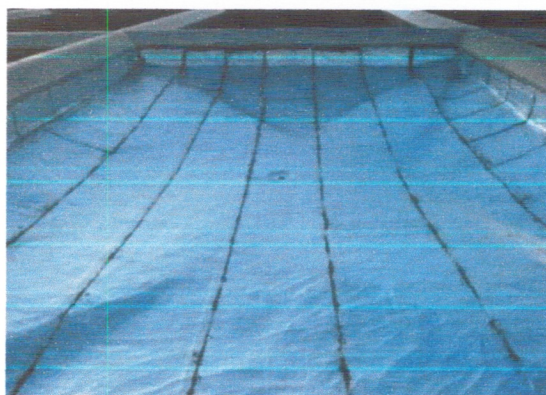

Celso Costa

Coord. de Manutenção/SINART-PI
Terminal Rod. Teresina
(86) 9.9962-4695 watts
(86) 9.9962-4695

Celso Sousa
Coordenador de Manutenção
SINART - RODOVIÁRIAS
