



117/2017

Teresina (PI), 10 de novembro de 2017.

Ao

Ilmo. Srs.

Membros do Comitê Gestor de Monitoramento - SUPARC

Nesta:

Ref.: **Relatório de Acompanhamento das Obras de Teresina - PI**

Prezados Senhores,

Segue impresso Relatório Técnico mensal de acompanhamento das obras do mês de outubro/2017 do Terminal Rodoviário de Teresina "Governador Lucídio Portella".

Certo de contarmos com vossa colaboração e compreensão de sempre, nos colocamos ao inteiro dispor e aproveitamos para renovar nossos protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

Robson Silva

Coordenador de Operações - SINART

Fone: (86) 3218-6146

Celular: (86) 9.9827 1170

robson.silva@sinart.com.br



RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS

TERMINAL RODOVIÁRIO DE TERESINA

REFORMA E MODERNIZAÇÃO


OUT/2017



Relatório de Acompanhamento

Setor	Serviços executados
Instalação do elevador	Iniciado e concluído a montagem da cabine do elevador. Executado assentamento de piso de granito na cabine do elevador. Todos os serviços concluídos. Elevador em funcionamento.
Restaurante 04 Pav. Superior	Concluído isolamento da área em madeirite. Iniciado serviço de demolições para limpeza da área. Iniciado e concluído serviço de alvenaria.
Sanitário da Plataforma de Embarque	Concluído serviço de reboco em alvenaria. Iniciado assentamento de revestimento cerâmico de piso e parede.

Reservatório Elevado	Aguardando chegada do material apropriado para concretagem dos nichos dos ganchos de sustentação do reservatório. Aguardando projeto alimentação do reservatório.
Estacionamento	Concluído os serviços do estacionamento. Estacionamento em funcionamento.
Praça de Alimentação ETAPA II	Iniciado serviço de isolamento da área para execução dos serviços. Iniciado remoção de esquadrias e demolição de paredes. Concluído assentamento de granito no peitoril para liberação da área a ser instalada a esquadria.
Impermeabilização	Continua o serviço de impermeabilização de pétalas do teto do terminal rodoviário. Iniciado contratação de uma segunda empresa para acelerar os serviços por conta do início do período chuvoso.
Lanchonetes ETAPA II	Iniciado os serviços de alvenaria das lanchonetes 03 a 06. Iniciado serviço de emassamento e assentamento de bancadas e rodapé de granito.



Pintura Geral do TR	Continua o serviço de pintura do terminal rodoviário contemplando as áreas comuns. Contratada uma segunda empresa para acelerar os serviços.
Sondagem da Área Anexa	Recebido laudo do serviço de sondagem na área a ser construída o anexo do terminal. Iniciado contratação da empresa para execução da topografia da área.
Guichês de Atendimento	Continua serviço de demolição de paredes existentes para liberação da área. Iniciado serviço de alvenaria em bloco cerâmico e gesso cartonado. Iniciado serviço de instalação elétrica dos guichês. Iniciado assentamento de bancadas de granito.






RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

OBRA: Ref. e modernização do terminal rodoviário de Teresina

SERVIÇOS EXECUTADOS

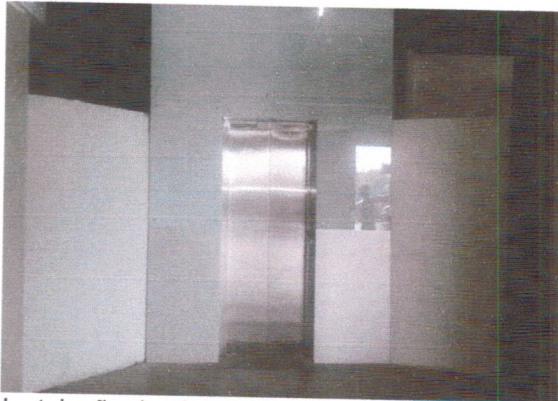


Instalação do elevador.



Restaurante 04.



Sanitário da Plataforma de Embarque.

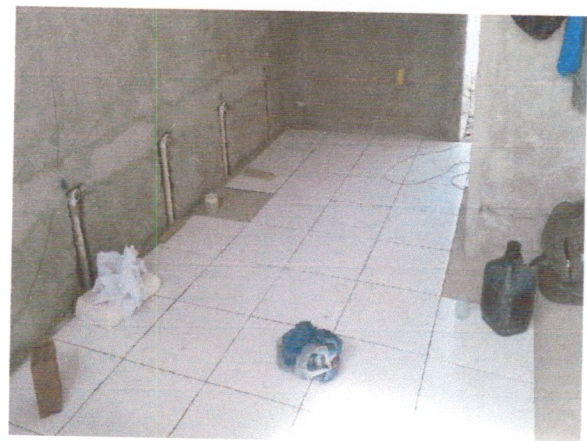




Estacionamento.



Praça de Alimentação.



Lanchonetes 03/04/05 e 06.

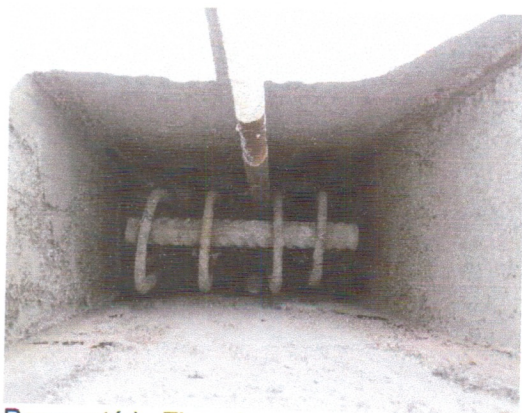

Reservatório Elevado.




[Handwritten signature]



Impermeabilização pétalas do teto.



Pintura Geral do TR

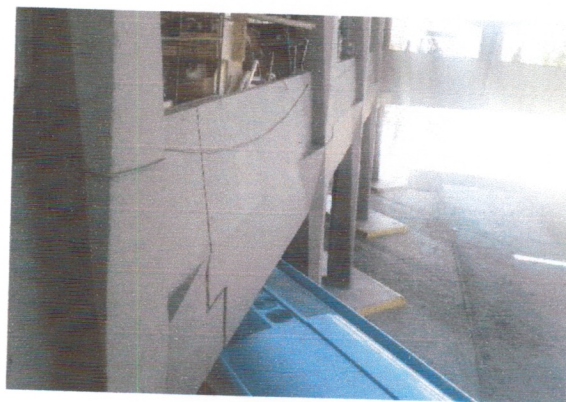


Celso Costa

Coord. de Manutenção/SINART-PI
Terminal Rod. Teresina
(86) 9.9962-4695 watts
(86) 9.9962-4695


Celso Sousa
Coordenador de Manutenção
SINART - RODOVIÁRIAS

