




RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS

TERMINAL RODOVIÁRIO DE PICOS

REFORMA E MODERNIZAÇÃO


Nº 01 JAN/2018





Relatório de Acompanhamento

Setor	Serviços executados
Macro drenagem ETAPA I	CONCLUÍDO os serviços de macro drenagem e pátio de manobras da ETAPA I, no terminal rodoviário.
	CONCLUÍDO o serviço de assentamento do piso Intertravado da ETAPA I no pátio de manobras.
	CONCLUÍDO o serviço de rejuntamento do piso intertravado no pátio de manobras.
	CONCLUÍDO o prolongamento da escavação da drenagem da área da segunda etapa para criar acesso dos ônibus a área do pátio concluída.
	CONCLUÍDO a compactação do piso intertravado do pátio de manobras para liberação da área.



Macro drenagem ETAPA II	Iniciado os serviços de escavação para construção das caixas de área da ETAPA II.
	Concluído levantamento topográfico da área correspondente a ETAPA II do pátio de manobras.



RECEBIDO
Em <u>21/02/18</u>
<u>[Signature]</u>
SUPARC/SEADPREV



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

OBRA: Ref. e modernização do terminal rodoviário de Picos

SERVIÇOS EXECUTADOS



Conclusão do Pátio de Manobras.



Conclusão do Pátio de Manobras.




[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

RECEBIDO
Em <u>27/09/18</u>
<u>[Signature]</u>
SUPARC/SEADPREV



Escavações ETAPA II.

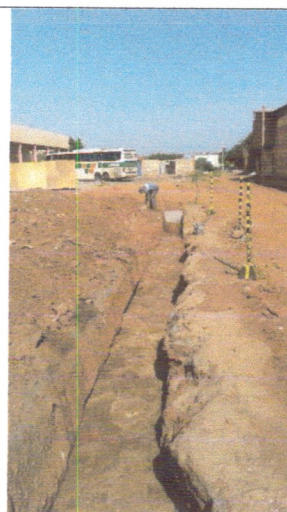

Topografia ETAPA II.

Celso Costa
 Coord. de Manutenção/SINART-PI
 Terminal Rod. Teresina
 (86) 9.9479-9035 watts
 (86) 9.9962-4695

Celso Sousa
 Coordenador de Manutenção
 SINART - RODOVIÁRIAS

Robson Silva
 Coordenador de Operações
 SINART - RODOVIÁRIAS

RECEBIDO
 Em 22/00/18
Robson
 SUPARC/SEADPREV
