

116/2017

Teresina (PI), 10 de novembro de 2017.

Ao
Ilmo. Srs.
Membros do Comitê Gestor de Monitoramento - SUPARC

Nesta:

Ref.: **Relatório de Acompanhamento das Obras de Teresina - PI**

Prezados Senhores,

Segue impresso Relatório Técnico mensal de acompanhamento das obras do mês de setembro/2017 do Terminal Rodoviário de Teresina "Governador Lucídio Portella".

Certo de contarmos com vossa colaboração e compreensão de sempre, nos colocamos ao inteiro dispor e aproveitamos para renovar nossos protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,



Robson Silva
Coordenador de Operações - SINART
Fone: (86) 3218-6146
Celular: (86) 9.9827 1170
robson.silva@sinart.com.br



RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS

TERMINAL RODOVIÁRIO DE TERESINA

REFORMA E MODERNIZAÇÃO


SET/2017



Relatório de Acompanhamento

Setor	Serviços executados
Instalação do elevador	Concluído o serviço de revestimento da cabine do elevador em alumínio composto e vidro temperado. Aguardando montador da cabine para início dos serviços.
Restaurantes Pav. Superior	Concluído todos os serviços. Restaurantes 01/02 e 03 em funcionamento.
Sanitário da Plataforma de Embarque	Concluído o serviço de alvenaria em bloco cerâmico. Concluído os serviços de laje da cobertura. Concluído os serviços de instalações hidráulicas.

Reservatório Elevado	Concluído a troca de ganchos de fixação por conta de emenda nos mesmos. Recebido laudo de tração dos ganchos.
Estacionamento	Concluído os serviços de instalação de placas da sinalização vertical. Continua o serviço de pintura da sinalização horizontal. Concluído os serviços de instalação das câmeras de monitoramento.
Praça de Alimentação	Concluído os serviços de instalação das esquadrias de alumínio e vidro do mirante.
Impermeabilização	Continua o serviço de impermeabilização de pétalas do teto do terminal rodoviário.
Sanitário masc./fem. Pavimento Superior.	Concluído todos os serviços. Sanitário em funcionamento.
Lanchonetes ETAPA II	Iniciado os serviços de construção das lanchonetes 03 a 06.



Pintura Geral do TR	Iniciado o serviço de pintura do terminal rodoviário contemplando as áreas comuns.
Recuperação da Área Externa	Iniciado e concluído a recuperação da área externa do terminal, contemplando a demolição, recuperação, pintura e reposição de bancos.
Sondagem da Área Anexa	Iniciado e concluído o serviço de sondagem na área a ser construída o anexo do terminal.
Guichês de Atendimento	Iniciado o serviço de tapume de madeirite para isolamento da área para início dos serviços. Iniciado serviço de demolição de paredes existentes para liberação da área.



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

OBRA: Ref. e modernização do terminal rodoviário de Teresina


SERVIÇOS EXECUTADOS



Instalação do elevador.



Restaurante Pav. Superior.

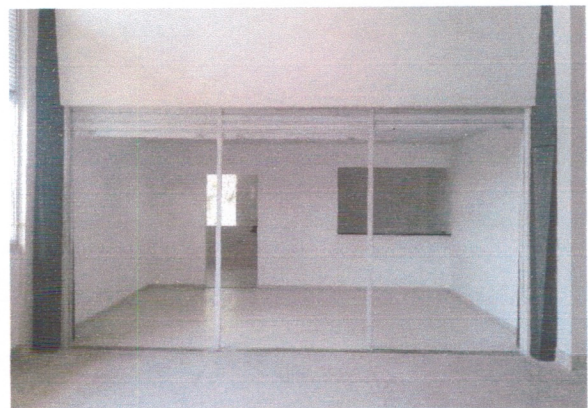

Sanitário Pav. Térreo.





Sanitário Pav. Superior.



Estacionamento.




Praça de Alimentação.



Lanchonetes 03/04/05 e 06.



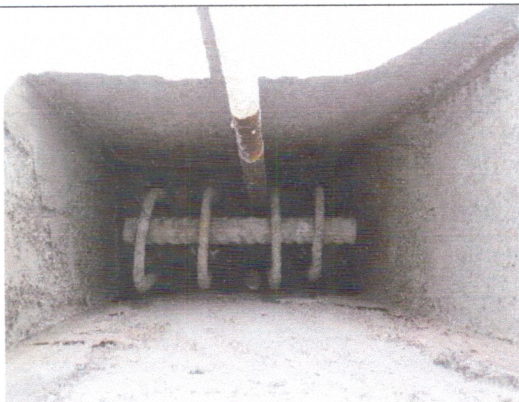

Reservatório Elevado.



Impermeabilização pétalas do teto.



Sanitário da Plataforma de Embarque



Pintura Geral do TR



[Handwritten signatures]



Recuperação da Área Externa



Sondagem da Área Anexa



Celso Costa
Celso Costa

Coord. de Manutenção/SINART-PI

Terminal Rod. Teresina

(86) 9.9962-4695 watts

(86) 9.9962-4695

Celso Sousa
Celso Sousa

Coordenador de Manutenção

SINART - RODOVIÁRIAS

[Signature]
