



128/2018

Teresina (PI), 10 de janeiro de 2018.

Ao

Ilmo. Srs.

Membros do Comitê Gestor de Monitoramento - SUPARC

Nesta:

Ref.: **Relatório de Acompanhamento das Obras de Teresina - PI**

Prezados Senhores,

Segue impresso Relatório Técnico mensal de acompanhamento das obras do mês de dezembro/2017 do Terminal Rodoviário de Teresina "Governador Lucídio Portella".

Certo de contarmos com vossa colaboração e compreensão de sempre, nos colocamos ao inteiro dispor e aproveitamos para renovar nossos protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,


Robson Silva

Coordenador de Operações - SINART

Fone: (86) 3218-6146

Celular: (86) 9.9827 1170

robson.silva@sinart.com.br





RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS

TERMINAL RODOVIÁRIO DE TERESINA

REFORMA E MODERNIZAÇÃO

DEZ/2017


RECEBIDO	
Em	<u>14/12/17</u>
<u>[Signature]</u>	
SUPARC/SEADPREV	

[Signature] [Signature]




Relatório de Acompanhamento


Setor	Serviços executados
Esquadrias de Alumínio	Continua o serviço de substituição das esquadrias antigas das lanchonetes e restaurantes do terminal rodoviário no pavimento superior.
Restaurante 04 Pav. Superior	Concluído todos os serviços da execução. Programado transferência de permissionário.
Sanitário da Plataforma de Embarque	Concluído o serviço de assentamento de revestimento cerâmico de piso e parede. Concluído a instalação elétrica. Concluído a montagem de luminárias, tomadas e interruptores. Concluído o serviço de assentamento de bancadas e divisórias de granito. Concluído a paginação de acesso ao sanitário em piso intertravado.




Reservatório Elevado	Recebido projeto alimentação do reservatório. Em fase contratual da empresa para execução das instalações para alimentação e distribuição do reservatório. Iniciado o processo de solicitação da ligação de água do reservatório através da empresa águas de Teresina.
Praça de Alimentação ETAPA II	Concluído o serviço de reposição de piso em granilite. Concluído o assentamento da esquadria de alumínio da fachada.
Impermeabilização	Continua o serviço de impermeabilização de pétalas do teto do terminal rodoviário pelas empresas KALFIX e J.F. Cunha.
Lanchonetes ETAPA II	Concluído todos os serviços da execução das lanchonetes e variedades da ETAPA II. Programada a transferência dos permissionários para início da ETAPA III.



Guichês de Atendimento	Concluído o assentamento das divisórias de vidros. Iniciado o assentamento de piso Paviflex na área interna e circulação dos guichês. Iniciado a recuperação do piso de granilite na área externa dos guichês.
Estacionamento	Iniciado a execução da estrutura metálica da cobertura da guarita do estacionamento do terminal rodoviário.
Shafts	Recebido o projeto do reforço estrutural das lajes a serem rompidas para execução dos 4 shafts do terminal rodoviário. Contratada a empresa para execução do reforço estrutural em vigas metálicas.
Projeto contra Incêndio	Contratada a empresa para execução do projeto contra incêndio e pânico do terminal. Iniciado os serviços civis do projeto contra incêndio do terminal.



Cabeamento Estruturado	Contratada a empresa para execução do projeto de cabeamento estruturado do terminal. Iniciado a instalação das eletrocalhas. Em fase de conclusão os serviços de execução da casa do DG do cabeamento estruturado.
Domus da Cobertura	Em fase de contratação da empresa para executar a substituição dos DOMUS do teto do terminal em acrílico para DOMUS em policarbonato.



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

OBRA: Ref. e modernização do terminal rodoviário de Teresina

SERVIÇOS EXECUTADOS




Instalações das Esquadrias.



Restaurante 04.



Sanitário da Plataforma de Embarque.






Praça de Alimentação.



Lanchonetes 03/04/05 e 06.




Reservatório Elevado.



Guichês de Atendimento.



Impermeabilização pétalas do teto.

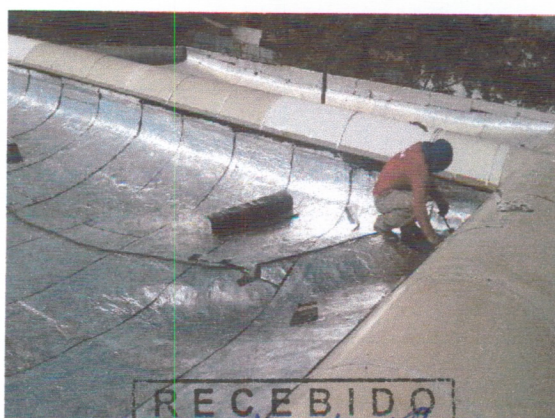

RECEBIDO
Em 22/08/18
[Signature]
SUPARC/SEADPREV



Cobertura da Guarita.



Casa de Gás.




Casa de DG.



Celso Costa
 Coord. de Manutenção/SINART-PI
 Terminal Rod. Teresina
 (86) 9.9962-4695 watts
 (86) 9.9962-4695

Celso Sousa
 Coordenador de Manutenção
 SINART - RODOVIÁRIAS

Robson Silva
 Coordenador de Operações
 SINART - RODOVIÁRIAS



FOLHA DE INFORMAÇÃO OU DESPACHO

Rubrica	Fls nº
Anexos	Número

do EMO,
Para conhecimento, para dar publicidade através
do site e instrução processual.
Em, 16.01.18


Viviane Moura Bezerra
Superintendente de Parcerias e Concessões
SUPARC/SEAD

**Piauí**
GOVERNO DO ESTADO

FOLHA DE INFORMAÇÃO OU DESPACHO

Rubrica	Fls nº
Anexos	Número

Teresina (PI), 16 de Janeiro de 2018.

Ao Apoio Técnico,

Ref.: Referente ao Comunicado 128/2017 – Rel. de Acompanhamento de obras de Teresina / Dezembro-2017

Em consonância com o despacho da Superintendente de Parcerias e Concessões, solicito encaminhamento do documento acima referenciado para os membros do Comitê de Monitoramento e FGV, (via *email* membros SUPARC, via formal e *email* para FGV) para atestação das informações presentes no mesmo, conforme vistoria mensal.

Após a demanda, juntar o documento ao processo para fins de instrução processual.


Lidiane C. Oliveira

Assessoria Jurídica

Superintendência de Parcerias e Concessões – SUPARC
