

# RELATÓRIO TRIMESTRAL

CONTRATO Nº 01/2021

CENTRO DE CONVENÇÕES DE TERESINA

SPE CENTRO DE CONVENÇÕES DE TERESINA S/A

Data: 01/10/2021

## RELATÓRIO

**1.1.** O presente Relatório de Execução tem a finalidade de fornecer informações para o Comitê de Monitoramento e Gestão - CMOG sobre o cumprimento das obrigações estipuladas no Contrato nº 01/2021, celebrado entre o Governo do Estado do Piauí, por meio da Secretaria de Turismo do Estado do Piauí - SETUR e a SPE Centro de Convenções do Piauí S/A, cujo objeto é a **CONCESSÃO DE USO ONEROSA, COM DESTINAÇÃO ESPECÍFICA, PARA MODERNIZAÇÃO, EXPLORAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕES DE TERESINA.**

O prazo da concessão é de 20 (vinte) anos, contados a partir da assinatura do Contrato, podendo ser prorrogado pelo CGP.

O referido Relatório se refere ao primeiro trimestre da vigência contratual, nos termos da cláusula 8.2.13 do Contrato e item 5, letra “a” do Manual de Gestão de Contratos de Concessões e Parcerias Público-Privadas do Estado do Piauí.

Período: 09 de junho de 2021 a 30 de setembro de 2021.

## 1.2. IDENTIFICAÇÃO

Edificação: Centro de Convenções.

Endereço: Marechal Castelo Branco, S/N, Bairro Cabral, Teresina - PI.



Imagem 1: ©2021 Maxar Technologies

Órgão: Superintendência de Parceria e Concessões (SUPARC).

Poder Concedente: Secretaria de Turismo do Estado do Piauí (SETUR).

## 1.3. FICHA TÉCNICA

Nome Oficial: Centro de Convenções de Teresina

Endereço: Rua Acre, Bairro Cabral, Teresina - PI.

Capacidade: 1.166 assentos no teatro e 8 auditórios em um total de 436 lugares.

Área do Terreno: 14.034,47 m<sup>2</sup>.

Pavimento Subsolo: 458,97 m<sup>2</sup>.

Pavimento Térreo: 3.963,86 m<sup>2</sup>.

Pavimento Superior: 2.058,88 m<sup>2</sup>.

Total de Área Construída: 6.624,08 m<sup>2</sup>.

Área do Estacionamento: 7.900 m<sup>2</sup> com vagas para 317 carros.

Proprietário: Governo do Estado do Piauí.

Manutenção: Secretaria de Turismo do Estado do Piauí (SETUR).

#### **1.4. DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS**

O Contrato foi assinado em 09 de junho de 2021 e o Termo de Entrega e Recebimento dos Bens Vinculados à Concessão - TERI, assinado no dia 28 de junho de 2021.

Considerando que, conforme Plano de Negócios, o início da operação do Centro de Convenções de Teresina está marcado para acontecer em 2022 e, conseqüentemente, estão sendo realizadas obras e reformas no local desde 29/06/2021, nos termos do Contrato (especialmente itens 15.1, 15.7 e 15.7.1), o presente relatório irá abordar, especialmente, esses itens, sem se olvidar, entretanto, de tudo o que foi desenvolvido até o dia 30/09/2021.

Cumprê destacar, neste sentido, as seguintes ações já desenvolvidas, além das citadas obras:

- Assinatura TERI (item 3.5 do Contrato);
- Início da Operação Assistida (item 3.6.2 do Contrato);
- Contratação de seguro (item 8.6 do Contrato);
- Indicação do responsável pela gestão do Contrato (item 8.7 do Contrato);
- Emissão da ART da obra;
- Constituição de SPE e registro (item 8.2.3.15, “e” e item 8.8 do Contrato);
- Aprovação dos projetos (item 15.2 do Contrato)
- Adequação de acessibilidade (item 8.2.23 do Contrato);
- Remoção dos quiosques de alimentação (item 2.4 do item 1 “Riscos de Implantação e de Engenharia” da Matriz de Risco). Muito embora o risco fosse Público, a Concessionária, por meio dos Termos de Acordos e Doações, disponibilizou quantia em espécie às proprietárias dos quiosques, a fim de que a retirada dos equipamentos fosse realizado de forma ordeira e socialmente responsável;
- Religação de água e esgoto;
- Abertura de processos para obtenção de Alvará e Licença Ambiental (item 8.2.26);
- Atualização do projeto do Centro de Convenções.

#### **1.5. OBRAS E REFORMAS**

Em relação às obras e reformas e as inspeções realizadas foram desenvolvidas em atendimento ao disposto na Norma de Inspeção Predial/2020 do IBAPE (Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia – Entidade Nacional) e da Norma de Manutenção em Edificações NBR 16.747:2020, da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas), que dispõe sobre as regras gerais e específicas a serem obedecidas na manutenção e conservação das edificações o qual, diga-se

Importante consignar que o prazo em princípio previsto para o início das atividades do Centro de Convenções de Teresina foi antecipado em quase 03 (três) meses, passando de 03/06/2022 para 12/03/2022.

Sem embargo do adiantamento do Plano de Execução, o que reforça o compromisso desta Concessionária com o projeto e o cumprimento de suas obrigações contratuais, importante que sejam trazidos no presente relatório as ações até então desenvolvidas:

- **Área externa e Estacionamento:**

- Foram executados os serviços de demolição,, alvenaria; reboco; construção de calçadas e reformas das existente,, topografia e nivelamento do terreno; instalação de bloquetes de cimento nas áreas (serviço 100% concluído);
- Área externa foi contemplada com novas instalações elétricas e colocação de postes de iluminação (iluminação 100% concluído )
- Instalação do gradil por todo o entorno com 02 portarias ( área concluída )
- Restauração integral do painel “turismo no Piauí”. Restaurado pelo próprio artista que assina a obra, Sr. Nonato Oliveira.

- **Administração:**

Demolição; retirada de entulhos; reboco; limpeza; alvenaria; pintura; hidráulica do banheiro e copa; colocação de forro; instalações elétricas e ar condicionado; iluminação e internet; sala mobiliada.

- **Auditórios:**

Demolição; retirada de entulhos; reboco; limpeza e alvenaria; utilizada caçambas de entulho; pintura; hidráulica de banheiros; contrapiso; serviços em andamento (instalações elétricas; ar condicionado; selagem; amaciamento da pintura de paredes ).

- **Palco (Teatro):**

Retirada de entulhos; reboco; limpeza e alvenaria; pintura; hidráulica de banheiros; contrapiso; dry wall nas laterais das paredes com sancas. Serviços em andamento (instalações elétricas; ar condicionado; selagem; amaciamento da pintura de paredes).

- **Hall Nobre:**

Retirada de entulhos; reboco; limpeza e alvenaria; pintura; hidráulica de banheiros; parede em dry wall da lanchonete. Serviços em andamento (instalações elétricas; ar condicionado; selagem; amaciamento da pintura de paredes; colocação estrutura teto para receber forro.

- **Salão Nobre:**

Retirada de entulhos; reboco; limpeza e alvenaria; pintura; hidráulica de banheiros. Serviços em andamento (instalações elétricas; ar condicionado; selagem; amaciamento da pintura de paredes; instalando teto de gesso em toda a área).

- **Restaurante:**

Retirada de entulhos reboco; limpeza e alvenaria; pintura; hidráulica de banheiros. Serviços em andamento (instalações elétricas; reforma da cozinha; ar condicionado; selagem; amaciamento da pintura de paredes; instalando teto de gesso em toda a área).

- **Pavilhão Inferior:**

Retirada de entulhos; reboco; limpeza e alvenaria; pintura; construção e hidráulica de banheiros. Serviços em andamento (instalações elétricas; ar condicionado; selagem; amaciamento da pintura de paredes; confecção do portão da entrada).

- **Pavilhão superior:**

Retirada de entulhos; reboco; limpeza e alvenaria; pintura; construção e hidráulica de banheiros. Serviços em andamento (instalações elétricas; ar condicionado; selagem; amaciamento da pintura de paredes; confecção do portão da entrada).

- **Vidros / Portas /ACM**

Foram trocadas e restauradas portas e vidros (colocadas novas portas e fechaduras); feita a limpeza e troca dos ACM do entorno do pavilhão e marquises.

- **Subestação:**

Retirada de entulhos; reboco; limpeza e alvenaria; pintura; impermeabilização das paredes.

- **Cisterna:**

Retirada de entulhos; reboco; limpeza e alvenaria; pintura; impermeabilização das paredes.

- **Telhado:**

Telhado foi corrigido, restaurado e colocadas novas calhas e pingadeiras; colocação de mantas e impermeabilização do perímetro.

- **Guardacorpos:**

Serralheria em andamento com a confecção dos guardacorpos em todo o complexo para atender as normas de bombeiro e acessibilidade.

## 1.6. REGISTRO FOTOGRÁFICO

A fim de ilustrar todos os trabalhos desenvolvidos, segue relatório fotográfico exemplificando o andamento das obras até a presente data.

**Figura 1**



28-06-2021 às 08h26 - Recebendo e posicionado duas caçambas de entulho na entrada do prédio pela avenida Castelo Branco.

**Figura 2**



29-06-2021 às 07h46 -Iniciando a retirada de entulhos e limpeza do pavilhão piso 1.

**Figura 03**



29-06-2021 às 07h48 - Equipe de limpeza interna recolhendo entulho e jogando em caçambas.

**Figura 04**



29-06-2021 às 08h13 - Equipe na externa no pátio 1 dando início a limpeza geral.

**Figura 05**



29-06-2021 as 08h13 Equipe na externa no pátio 1 dando início a limpeza geral.

**Figura 06**



29-06-2021 às 08h29 - Segue limpeza no pavilhão piso 1.

**Figura 07**



29-06-2021 às 08h42 - Equipe da Setur presente no início da limpeza da obra.

**Figura 08**



29-06-2021 às 08h48 - Repassando informações do projeto atualizado.

**Figura 09**



29-06-2021 às 09h19 - Recebendo banheiro químico para funcionamento da obra.

**Figura 10**



29-06-2021 às 09h38 - Reunião com operadoras das lanchonetes no estacionamento pátio 3.

**Figura 11**



29-06-2021 às 10h14 - Recolhendo caçamba de entulho do pátio 1.

**Figura 12**



29-06-2021 às 10h25 - Segue limpeza no pátio 01.

**Figura 13**



29-06-2021 às 17h20 - Pátio 1 com grande parte da limpeza finalizada.

**Figura 14**



30-06-2021 às 08h00 - Equipe de limpeza externa iniciando corte de mato no pátio 3.

**Figura 15**



30-06-2021 às 08h11 - Segue limpeza do piso 1 restaurante.

**Figura 16**



30-06-2021 às 08h29 - Status de limpeza do pátio 1.

**Figura 17**



30-06-2021 às 08h35 - Pátio 1 na lateral com a subestação já com poda de mato finalizada.

**Figura 18**



30-06-2021 às 09h07 - Limpeza interna atuando no hall principal do teatro.

**Figura 19**



30-06-2021 às 09h12 - Segue limpeza do teatro e mezanino.

**Figura 20**



30-06-2021 às 09h28 - Isolando acessos do pátio 2 devido ao acesso de caminhão caçamba.

**Figura 21**



30-06-2021 às 10h09 – Equipe de limpeza em atividade na área do restaurante.

**Figura 22**



30-06-2021 às 10h09 – Equipe de limpeza em atividade na área do restaurante.

**Figura 23**



30-06-2021 às 11h10 - Sendo retirado as caçambas 07e 08.

**Figura 24**



30-06-2021 às 11h17 - Status de limpeza na área externa pátio 1.

**Figura 25**



30-06-2021 às 13h47 - Equipe de limpeza interna atuando no piso térreo do antigo estacionamento.

**Figura 26**



30-06-2021 às 14h01 - Empresa concessionária Águas de Teresina fazendo instalação de esgoto do pavilhão.

**Figura 27**



**Figura 28**



**Figura 29**



30-06-2021 às 15h35 - Equipe da concessionária de água segue em atividade na implantação da rede de esgoto.

**Figura 30**



30-06-2021 às 16h39 - Equipe de limpeza em atividade no pátio 2.

**Figura 31**



01-07-2021 às 07h19 - Finalizada implantação do esgoto.

**Figura 32**



01-07-2021 às 10h35 - Abrindo porta de acesso do pátio 2 para auditório.

**Figura 33**



01-07-2021 às 13h30 - Sendo retirado a caçamba 11.

**Figura 34**



01-07-2021 às 17h55 - Status de limpeza do pátio 1.

**Figura 35**



02-07-2021 às 07h29 - Equipe de limpeza externa iniciando os trabalhos com máquina e caminhão.

**Figura 36**



02-07-2021 às 07h42 - Status de limpeza do pátio 01.

**Figura 37**



02-07-2021 às 07h50 - Tivemos período de 10 horas de chuva , segue pontos de goteira , acima área de palco auditório.

**Figura 38**



02-07-2021 às 07h58 - Infiltração parede auditório lado pátio 2 ,( vazamento na calha )

**Figura 39**



02-07-2021 às 08h13 - Ponto de goteira1 no Hall.

**Figura 40**



02-07-2021 às 08h14 - Goteira no Hall( na interligação parede de auditório.

**Figura 41**



02-07-2021 às 08h15 - Equipe de impermeabilização realizando vistoria no telhado.

**Figura 42**



02-07-2021 às 08h16 - Vazamentos e goteiras na interligação Marquise Pátio 3 e pavilhão.

**Figura 43**



02-07-2021 às 09h36 - Status da limpeza pátio 3.

**Figura 44**



02-07-2021 às 09h41 - Vazamento, goteira na parede(calha) restaurante lado escada acesso hall.

**Figura 45**



02-07-2021 às 09h45 - ligação de relógio de água concluída pela concessionária.

**Figura 46**



02-07-2021 às 09h48 - Vazamento na interligação da calha na cozinha.

**Figura 47**



02-07-2021 às 09h54 - Goteira (calha) auditório superior, próximo elevador PCD.

**Figura 48**



02-07-2021 às 10h03 - Estacionamento piso 1, molhando devido abertura rampa de acesso piso 2 estacionamentos.

**Figura 49**



02-07-2021 às 10h05 - Goteira piso 1

**Figura 50**



02-07-2021 às 10h23 - Sendo retirado a caçambas de 13e 14.

**Figura 51**



02-07-2021 às 11h01 - Status de limpeza do pátio 2.

**Figura 52**



02-07-2021 às 15h41 -Status de limpeza do pátio 3.

**Figura 53**



03-07-2021 às 07h45 - Limpeza em atividade no pátio 1 (entrada).

**Figura 54**



03-07-2021 às 07h51 - Afundamento no asfalto área de 0,50 x 1,10 (acionando a concessionária de esgoto).

**Figura 55**



03-07-2021 às 09h30 - Segue limpeza do pátio 3.

**Figura 56**



03-07-2021 às 10h26 - Equipe de demolição interna em atividade no sub solo.

**Figura 57**



03-07-2021 às 10h29 - Empresa de caçamba de entulho realizando a troca de caçambas.

**Figura 58**



03-07-2021 às 13h35 - Status de demolição das salas do auditório.

**Figura 59**



03-07-2021 às 14h28 - Equipe de demolição interna no subsolo em atividade no primeiro Hloco.

**Figura 60**



03-07-2021 às 15h20 - Status de limpeza do pátio 3.

**Figura 61**



03-07-2021 às 16h55 - Status de limpeza do pátio 2.

**Figura 62**



03-07-2021 às 17h24 - Status de limpeza do pátio 01.

**Figura 63**



03-07-2021 às 17h59 - Status de limpeza do pátio 02.

**Figura 64**



03-07-2021 às 13h31 - Retirando dejetos do banheiro químico.

**Figura 65**



04-07-2021 às 09h53 – Seguem os trabalhos

**Figura 66**



05-07-2021 às 07h35 - Equipe de demolição interna na ativa.

**Figura 67**



05-07-2021 às 08h47 - Status de limpeza no pátio 3.

**Figura 68**



05-07-2021 às 09h10 - Status de limpeza do pátio 1.

**Figura 69**



05-07-2021 às 09h27 - Blocos intercalados 0,10 x 0,19 cm.

**Figura 70**



05-07-2021 às 09h28 - Bloquetes com 2 medidas de altura 0.2 e 0.6 cm.

**Figura 71**



05-07-2021 às 10h25 - Status de limpeza do pátio 1.

**Figura 72**



05-07-2021 às 10h41 - Status de demolição na área de acesso aos auditórios.

**Figura 73**



05-07-2021 às 13h40 - Sendo retirado as caçambas 22 e 23.

**Figura 74**



05-07-2021 às 14h32 - Status de limpeza do pátio 2.

**Figura 75**



05-07-2021 às 14h32 - Status de limpeza do pátio 3.

**Figura 76**



05-07-2021 às 15h08 - Sendo retirado as caçambas 25 e 26.

**Figura 77**



05-07-2021 às 16h48 - Status de limpeza da área do estacionamento pátio 3.

**Figura 78**



05-07-2021 às 17h08 - Status de limpeza do estacionamento 01.

**Figura 79**



05-07-2021 às 17h08 - Status de limpeza do pátio estacionamento 2.

**Figura 80**



06-07-2021 às 07h17 - Reunião sobre cuidados e normas quanto a limpeza e uso de EPI.

**Figura 81**



06-07-2021 às 07h30 - Status de demolição da parede e limpeza do auditório grande 01.

**Figura 82**




06-07-2021 às 07h35 - Equipe de limpeza externa na atividade no pátio 3.

**Figura 83**




06-07-2021 às 07h35 - Equipe de limpeza na execução de limpeza no pátio 3.

**Figura 84**

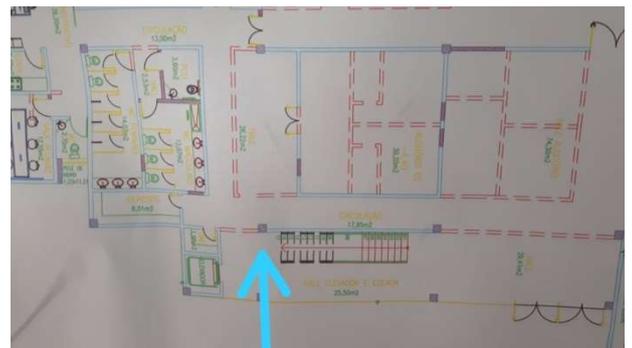

06-07-2021 às 07h39 - Status de demolição das paredes e limpeza hall acesso administração e auditório 3.

**Figura 85**

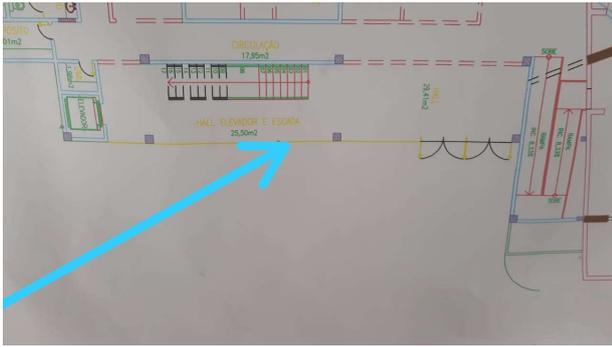

06-07-2021 às 07h44 - Status demolição parede e limpeza do hall piso térreo acesso auditório.

**Figura 86**



06-07-2021 às 07h53 - Demolição das paredes e limpeza da área administrativa.

**Figura 87**



06-07-2021 às 07h57 - Equipe demolindo parede e limpando área primeiro piso restaurante.

**Figura 88**



06-07-2021 às 08h03 -Equipe de limpeza em atividade no pátio 1 , salas subestação.

**Figura 89**



06-07-2021 às 08h06 - Status de limpeza do pátio 3.

**Figura 90**



06-07-2021 às 08h22 - Sendo retirado caçamba 26.

**Figura 91**



06-07-2021 às 08h31 - Sendo retirado a caçamba 27.

**Figura 92**



06-07-2021 às 08h31 - Equipe de limpeza em atividade na área do pátio 2 estacionamentos restaurante.

**Figura 93**



06-07-2021 às 09h29 - Realizando visita técnica com equipe de refrigeração (ar-condicionado).

**Figura 94**



06-07-2021 às 09h38 - Retirando e limpando comunicação da fachada do pavilhão fundos.

**Figura 95**



06-07-2021 às 09h45 - Equipe de Total Impermeabilização realizando visita técnica no telhado.

**Figura 96**



06-07-2021 às 09h55 - Finalizando a retirada das placas de comunicação visual dos fundos do pavilhão.

**Figura 97**



06-07-2021 às 10h10 - Placa de comunicação visual da fachada fundos pavilhão retirada.

**Figura 98**



06-07-2021 às 10h50 - Sendo retirado as caçambas 28 e 29.

**Figura 99**



06-07-2021 às 10h50 - Status de demolição e limpeza no piso térreo.

**Figura 100**



06-07-2021 às 11h03 - Status de limpeza do pátio.

**Figura 101**



06-07-2021 às 14h29 - Sendo retirado as caçambas 30 e 31.

**Figura 102**



06-07-2021 às 16h06 - Equipe ACM fazendo orçamento para reposição do teto 2,40x 3,00 mtrs.

**Figura 103**



06-07-2021 às 17h18 - Status de limpeza do pátio 2.

**Figura 104**



07-07-2021 às 07h16 - Equipe em atividade na limpeza fina do pátio 1.

**Figura 105**



07-07-2021 às 07h33 - Começando trabalhos no piso 1, área auditório e administração.

**Figura 106**



07-07-2021 às 07h34 - Equipe externa iniciando com aplicação de produto no piso do estacionamento.

**Figura 107**



07-07-2021 às 07h45 - Iniciando a dedetização da área interna e externa do pavilhão.

**Figura 108**



07-07-2021 às 08h29 - Equipe da concessionária água finalizando esgoto.

**Figura 109**



07-07-2021 às 08h34 - Equipes de limpeza e dedetização em atividade no pátio 1.

**Figura 110**



07-07-2021 às 09h09 - Limpeza do pátio 1 em andamento.

**Figura 111**



07-07-2021 às 09h29 - Limpeza em atividade pátio 1.

**Figura 112**



07-07-2021 as 09h39 - Sendo retirado as caçambas 35e36.

**Figura 113**



07-07-2021 às 10h38 - Finalizando limpeza do pátio 2.

**Figura 114**



07-07-2021 às 10h42 - Realizando visita técnica de com empresa de mármore para revestimento de alguns ambientes.

**Figura 115**



07-07-2021 às 11h15 - Status de demolição das paredes da área hall nobre.

**Figura 116**



07-07-2021 às 11h20 - Concluído a abertura de acesso a cozinha.

**Figura 117**



07-07-2021 às 11h22 - Equipe de engenharia elétrica fazendo levantamento de iluminação no estacionamento.

**Figura 118**



07-07-2021 às 13h22 - Sendo retirado as caçambas 37e 38.

**Figura 119**



07-07-2021 às 13h32 - Dedetização em andamento.

**Figura 120**



07-07-2021 às 13h32 - Status de limpeza do pátio 4.

**Figura 121**



07-07-2021 às 16h05 - Status de demolição no acesso do hall no auditório.

**Figura 122**



07-07-2021 às 16h08 - Status de demolição no Hall nobre.

**Figura 123**



07-07-2021 às 16h27 - Sendo retirado as caçambas 39 e 40.

**Figura 124**



07-07-2021 às 16h56 - Chaveiro trocando fechaduras e segredo das portas de acesso ao pavilhão.

**Figura 125**



08-07-2021 às 07h56 - Status de limpeza fina no pátio do estacionamento 3.

**Figura 126**



08-07-2021 às 08h37 - Status de limpeza fina no pátio 3.

**Figura 127**



08-07-2021 às 08h48 - Sendo retirado as caçambas 41 e 42.

**Figura 128**



08-07-2021 às 08h51 - Equipe demolição em atividade na área restaurante.

**Figura 129**



08--07-2021 às 11h17 - Recebendo um caminhão de área com 1m<sup>3</sup>.

**Figura 130**



08-07-2021 às 13h21 - Retroescavadeira finalizando limpeza pátio 3.

**Figura 131**



08-07-2021 às 13h58 - Máquina quebrando área de pedestre no acesso do restaurante.

**Figura 132**



08-07-2021 às 14h05 - Status de limpeza do pátio 3.

**Figura 133**



08-07-2021 às 14h51 - Status de limpeza no pátio 2.

**Figura 134**



08-07-2021 às 15h04 - Sendo retirado as caçambas 44 e 45.

**Figura 135**



08-07-2021 às 15h10 - Status de demolição no pátio 2.

**Figura 136**



08-07-2021 às 15h27 - Status de limpeza do piso do restaurante.

**Figura 137**



08-07-2021 às 15h27 - Status de limpeza do pátio 2.

**Figura 138**



08-07-2021 às 15h27 - Status de limpeza do pátio 2.

**Figura 139**



09-07-2021 às 08h25 - Status de demolição das salas auditórios.

**Figura 140**



09-07-2021 às 08h25 - Status de demolição das salas dos auditórios.

**Figura 141**



09-07-2021 às 08h39 - Status de demolição na área do restaurante.

**Figura 142**



09-07-2021 às 08h45 - Status da abertura do vão do portão teatro.

**Figura 143**



09-07-2021 às 10h01 - Status de demolição na área administrativa.

**Figura 144**



09-07-2021 às 15h59 - Sendo retirado as caçambas 46 e 47.

**Figura 145**



09-07-2021 às 16h34 - Status de demolição na área do Hall de acesso aos auditórios.

**Figura 146**



09-07-2021 às 16h40 - Status de demolição no Hall nobre.

**Figura 147**



09-07-2021 às 16h43 - Status de limpeza do pátio 2.

**Figura 148**



09-07-2021 às 16h46 - Status de demolição nas área restaurante.

**Figura 149**



09-07-2021 às 17h34 - Sendo retirado as caçambas 48 e 49.

**Figura 150**



10-07-2021 às 08h50 - Finalizado reenquadramento área que será colocado portão de acesso pátio 2 X teatro.

**Figura 151**



10-07-2021 às 10h22 - Segue sendo retirada telhas aranha de diversas áreas do pavilhão.

**Figura 152**



10-07-2021 às 10h25 - Status do trabalho de alvenaria no teatro.

**Figura 153**



10-07-2021 às 12h59 - Status de serviço de alvenaria do acesso ao palco do teatro.

**Figura 154**



12-07-2021 às 08h51 - Tudo no tijolo camada de massa 5 cm.

**Figura 15**



12-07-2021 às 09h06 - lado da avenida castelo Branco, área de calçada com poucas avarias, camada concreto 5cm.

**Figura 156**



12-07-2021 às 10h04 - Status de demolição no Hall de acesso aos auditórios.

**Figura 157**



12-07-2021 às 13h57 - Status de trabalho na área administrativa.

**Figura 158**



12-07-2021 às 16h47 - Status de limpeza e aproveitamento dos pisos na área administrativa.

**Figura 159**



13-07-2021 às 10h02 - Portão de acesso estacionamento X teatro finalizado.

**Figura 160**



13-07-2021 às 10h14 - Sendo retirado as caçambas 50 e 51.

**Figura 161**



13-07-2021 às 12h22 - Chaveiro abrindo e fazendo nova chave e segredo para acesso área de serviço do restaurante.

**Figura 162**



13-07-2021 às 16h08 - Finalizando a instalação do ACM.

**Figura 163**



13-07-2021 às 16h22 - Sendo retirado a caçamba número 53.

**Figura 164**



13-07-2021 às 16h48 - Status do serviço de alvenaria, fechando porta banheiro masculino (inversão porta) banheiros auditórios.

**Figura 165**



14-07-2021 às 15h05 - Falta placa, driver.

**Figura 166**



13-07-2021 às 16h48 - Status de demolição e limpeza dos auditórios.

**Figura 167**



14-07-2021 às 15h24 - Status de demolição na área de acesso restaurante X estacionamento 3.

**Figura 168**



14-07-2021 às 17h51 - Status do trabalho de alvenaria na área de acesso estacionamento X restaurante.

**Figura 169**



15-07-2021 às 08h25 - Status de demolição no acesso restaurante X estacionamento.

**Figura 170**



15-07-2021 às 11h26 -Lavando os vidros da fachada na área externa.

**Figura 171**



15-07-2021 às 14h26 - Retirando as caçambas 54 e 55.

**Figura 172**



15-07-2021 às 15h33 - Status de construção da escada de acesso ao palco.

**Figura 173**



15-07-2021 às 16h27 - Equipe técnica Thyssenkrupp realizando VT nas plataformas e elevador.

**Figura 174**



16-07-2021 às 09h05 - Infiltração de água no piso 2.

**Figura 175**



16-07-2021 às 09h06 - Infiltração de água no piso 2.

**Figura 176**




16-07-2021 às 09h08 - Infiltração na ranhura piso 2 em toda extensão.

**Figura 177**



16-07-2021 às 10h28 - Status de limpeza no estacionamento piso 2.

**Figura 178**

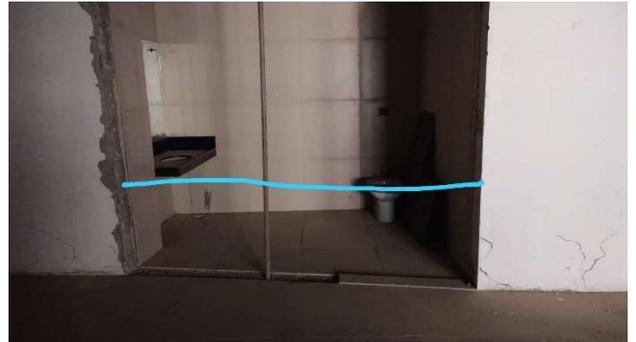

16-07-2021 às 11h18 - Abertura com 2,49m.

**Figura 179**



16-07-2021 às 11h20 - No feminino ao entrar temos está parede.

**Figura 180**



16-07-2021 às 14h08 - Status da escada do palco.

**Figura 181**



16-07-2021 às 15h40 - Status de limpeza dos vidros.

**Figura 182**



16-07-2021 às 17h20 - Sendo retirado a caçamba 56.

**Figura 183**



16-07-2021 às 17h33 - Status do pátio estacionamento.

**Figura 184**



16-07-2021 às 17h48 - Status dos trabalhos efetuados área externa.

**Figura 185**



16-07-2021 às 17h48 - Status trabalhos efetuados área externa.

**Figura 186**



16-07-2021 às 17h49 - Status dos trabalhos efetuados área externa.

**Figura 187**



16-07-2021 às 17h49 - Status trabalhos efetuados área externa.

**Figura 188**



16-07-2021 às 17h50 - Status trabalhos efetuados área externa.

**Figura 189**



16-07-2021 às 17h51 - Status trabalhos efetuados área externa.

**Figura 190**



17-07-2021 às 10h12 - Sendo retirado as cambas 57e58.

**Figura 191**



17-07-2021 às 13h53 - Vaso sanitário com válvulas ,07 unidades.

**Figura 192**



17-07-2021 às 13h54 - Vasos sanitário com caixa acoplada - 17 unidades.

**Figura 193**



19-07-2021 às 09h12 - Sendo retirado as caçambas 59 e 60.

**Figura 194**



19-07-2021 às 10h27 - Descarregando areia.

**Figura 195**




19-07-2021 às 16h09 - Status de instalação do piso bloquete.

**Figura 196**



19-07-2021 às 16h56 - Sendo retirando caçamba 61.

**Figura 197**

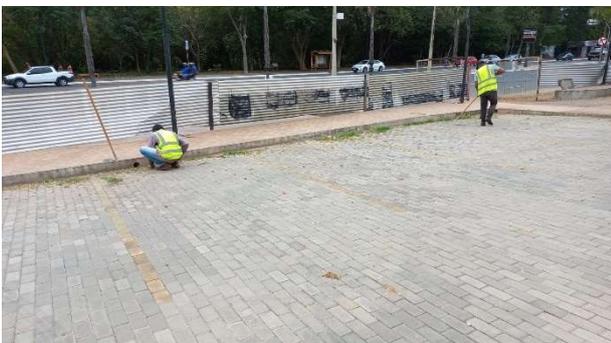

20-07-2021 às 07h24 - Retirando o restante de mato que não morreu pós veneno.

**Figura 198**



20-07-2021 às 08h14 - Sendo retirado a caçamba 62.

**Figura 199**



20-07-2021 às 10h14 - 1- porta acesso Hall teatro (vidro quebrado).

**Figura 200**



20-07-2021 às 10h15 - 2- janela externa lado estacionamento 3.

**Figura 201**



20-07-2021 às 10h16 - 3 janelas externa ADM quebradas.

**Figura 202**



20-07-2021 às 10h17 4- vidro frente principal, 3 pontos marcados (tipo pedra quando bate no vidro).

**Figura 203**



20-07-2021 às 10h18 - 5 vidros rachado na frente principal.

**Figura 204**



20-07-2021 às 10h18 - 6-vidro rachado frente principal.

**Figura 205**



20-07-2021 às 10h19 - 7- vidro frente principal com 2 marcas (tipo batida pedra ).

**Figura 207**



20-07-2021 às 10h19 - 8- vidro quebrado entrada principal.

**Figura 207**



20-07-2021 às 10h19 -9- janela Hall nobre fundos subestação.

**Figura 208**



20-07-2021 às 10h19 -10 - janela Hall elevador pavilhão superior.

**Figura 209**



20-07-2021 às 10h19 -11- janela quebrada Hall nobre.

**Figura 210**




20-07-2021 às 17h17 - Status demolição lado da rua Acre.

**Figura 211**




21-07-2021 às 09h01 - Sendo retirado a caçamba 63.

**Figura 212**

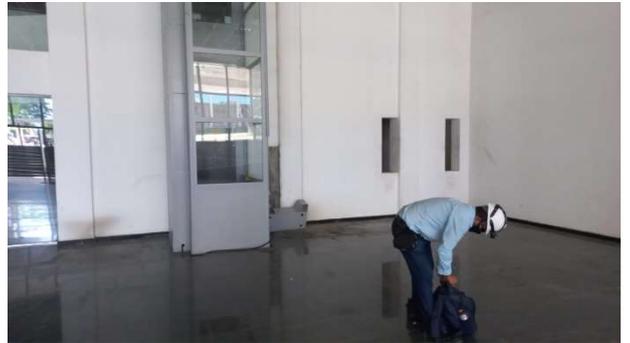

21-07-2021 às 13h32 - Visita do Sr. Adriano da empresa de elevadores Thyssen Grup (orçamento).

**Figura 213**

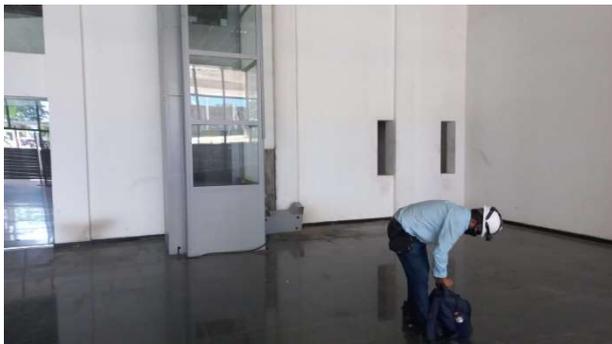

21-07-2021 às 13h32 - Visita do Sr. Adriano da empresa de elevadores Thyssen Grup (orçamento).

**Figura 214**



21-07-2021 às 15h07 - Status de obra na calçada rua do Fórum.

**Figura 215**



21-07-2021 às 15h34 - Status de obra do acesso estacionamento 2e3.

**Figura 216**



21-07-2021 às 16h14 - Status da rampa de acesso ao teatro.

**Figura 217**



21-07-2021 às 17h19 - Status da calçada na rua do Fórum.

**Figura 218**



22-07-2021 às 07h35 - Equipe de demolição em atividade.

**Figura 219**



22-07-2021 às 08h51 - Sendo realizado a limpeza do banheiro químico.

**Figura 220**



22-07-2021 às 10h39 - Status de obra das calçadas.

**Figura 221**



22-07-2021 às 13h15 - Sendo retirado a caçamba 64.

**Figura 222**



22-07-2021 às 13h21 - Começando prepara terreno para instalação dos bloquetes no estacionamento 3.

**Figura 223**



22-07-2021 às 13h38 - Equipe de instalação dos bloquete em atividade no estacionamento 2.

**Figura 224**



22-07-2021 às 15h42 – Vistoria da Porto Seguro com Sr. Raimundo.

**Figura 225**



22-07-2021 as 16h36 vistoria Porto Seguro finalizada.

**Figura 226**



23-07-2021 às 08h42- Equipe em atividade nos serviços da calçada.

**Figura 227**



23-07-2021 às 08h52 - Equipe de hidráulica em atividade na área da Adm.

**Figura 228**



23-07-2021 às 09h16 - Descarregando areia.

**Figura 229**



23-07-2021 às 11h18 - Status de instalação dos bloquetes no estacionamento 03.

**Figura 230**



23-07-2021 às 11h20 - Status da calçada estacionamento 03.

**Figura 231**



23-07-2021 às 14h45 - Status dos trabalhos nas calçadas.

**Figura 232**



23-07-2021 às 17h28 - Status de instalação dos bloquetes na interligação dos estacionamentos 2-3.

**Figura 233**



23-07-2021 às 17h36 - Status dos trabalhos nas calçadas estacionamento 03.

**Figura 234**



23-07-2021 às 17h38 - Status da instalação dos bloquetes no estacionamento 03.

**Figura 235**




24-07-2021 às 09h16 - Aplicando a segunda demão de veneno no estacionamento 03.

**Figura 236**



24-07-2021 às 09h22 - Status dos trabalhos de alvenaria nos auditórios.

**Figura 237**

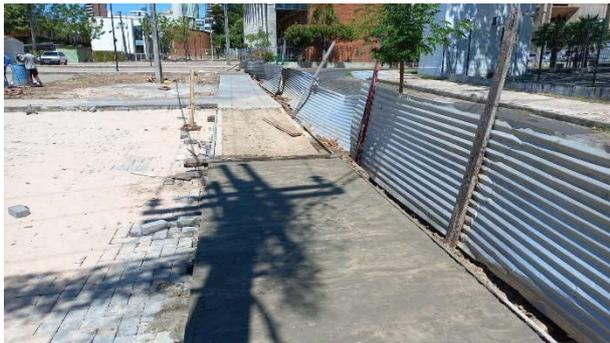

24-07-2021 às 12h32 - Status dos trabalhos na calçada e instalação dos bloquete no estacionamento 03.

**Figura 238**



24-07-2021 às 12h57 - Finalizado o complemento dos bloquetes na frente da área dos geradores.

**Figura 239**



24-07-2021 às 14h30 - ADM limpa e pronta para receber complementação piso.

**Figura 240**



24-07-2021 às 15h17 - Finalizado a calçadas da Rua Acre e do Fórum.

**Figura 241**



24-07-2021 às 15h20 - Status da instalação dos bloquetes no estacionamento 03.

**Figura 242**



24-07-2021 às 16h28 - Finalizado os trabalhos de alvenaria na parede de entrada de serviços do restaurante.

**Figura 243**



26-07-2021 às 09h10 - Sendo retirado a caçamba 66.

**Figura 244**



26-07-2021 às 10h53 - Sendo feito limpeza nos banheiros químicos.

**Figura 245**



26-07-2021 às 11h12 - Status de acabamento na parede no estacionamento da rua Acre.

**Figura 246**



27-07-2021 às 08h52 - Status de acabamento na área do estacionamento.

**Figura 247**



27-07-2021 às 15h16 – Dando início a troca dos vidros quebrados do pavilhão.

**Figura 248**



28-07-2021 às 08h11 - Status de serviços de alvenaria na área da ADM.

**Figura 249**



28-07-2021 às 09h13 - Descarregando carga de Mairinque com mobiliários, grades e diversos.

**Figura 250**



29-07-2021 às 14h20 - Status da retirada de entulhos.

**Figura 251**



29-07-2021 às 15h10 - Status de instalação da cerca na frente do pavilhão.

**Figura 252**



29-07-2021 às 15h13 - Sendo feito a entrada para estacionamento na frente do pavilhão.

**Figura 253**



29-07-2021 às 16h12 - Status dos serviços com a retro escavadeira, fazendo acesso estacionamento frente.

**Figura 254**



29-07-2021 às 16h42 - Encerrado os trabalhos com caçambas.

**Figura 255**



30-07-2021 às 09h08 - Sendo retirado a caçamba de número 68.

**Figura 256**



30-07-2021 às 09h53 - Sendo feito limpeza nos banheiros químicos.

**Figura 257**



30-07-2021 às 10h37 - Visita da empresa de estacionamento.

**Figura 258**



31-07-2021 às 10h16 - Primeiro poste retirado pela equipe de elétrica.

**Figura 259**



31-07-2021 às 11h00 - Equipe de eletricitista iniciando a passagem de cabo para ligação elétrica provisória.

**Figura 260**



31-07-2021 às 11h58 - Sendo retirado as caçambas 69 e 70.

**Figura 261**



31-07-2021 às 14h28 - Equipe de elétrica em atividade no pavilhão.

**Figura 262**



31-07-2021 às 17h23 - Equipe de elétrica realizando fechamento do quadro da ligação provisória.

**Figura 263**



31-07-2021 às 18h20 - Ligação elétrica provisória concluída.

**Figura 264**



31-07-2021 às 18h43 - Subsolo.

**Figura 265**



31-07-2021 às 18h48 - Iluminação na área do teatro ligada.

**Figura 266**



01-08-2021 às 10h37 - Para seguir com alinhamento do piso precisar remanejar este pedaço.

**Figura 267**



01-08-2021 às 10h51 - Laje da ADM com produto de impermeabilização aplicado.

**Figura 268**



02-08-2021 às 08h56 - Fechamento de grade dando início na lateral da assembleia.

**Figura 269**



02-08-2021 às 11h10 - Dr<sup>a</sup> Viviane realizando bate papo com equipe de obra.

**Figura 270**



02-08-2021 às 14h22 - Chaveiro instalando fechaduras porta ADM.

**Figura 271**



02-08-2021 às 14h39 - Status montagem cercas lado da assembleia legislativa.

**Figura 272**



02-08-2021 às 14h43 - Realizando novamente VT com equipe da Otis elevadores.

**Figura 273**



02-08-2021 às 15h26 - Status dos serviços de alvenaria na subestação.

**Figura 274**




02-08-2021 às 16h07 - Finalizada parede de acesso ao restaurante X estacionamento 03.

**Figura 275**



02-08-2021 às 16h20 - Equipe de artistas em visita para começar revitalização arte frente pavilhão.

**Figura 276**

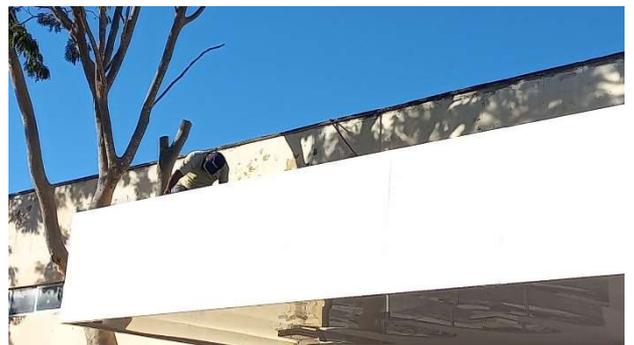

02-08-2021 às 16h42 - Equipe de serralheiros em atividade nas calhas.

**Figura 277**



02-08-2021 às 17h38 - Status de impermeabilização da ADM.

**Figura 278**



02-08-2021 às 17h40 - Status dos trabalhos na área da administração.

**Figura 279**



03-08-2021 às 07h47 - Aplicando a quarta demão da impermeabilização na ADM.

**Figura 280**



03-08-2021 às 11h45 - Status de instalação dos bloquetes no estacionamento 3.

**Figura 281**



03-08-2021 às 13h41 - Caixas de passagem para elétrica externa.

**Figura 282**



03-08-2021 às 13h51 - Equipe do ar realizando montagem de peças no palco do teatro.

**Figura 283**



03-08-2021 às 16h39 - Sendo retirado as caçambas 71e 72.

**Figura 284**



04-08-2021 às 07h50 - Status de serviços na área da ADM.

**Figura 285**



04-08-2021 às 08h05 - Status de serviços da equipe de serralheiros no telhado.

**Figura 286**



04-08-2021 às 08h13 - Status de instalação da cerca belgo.

**Figura 287**



04-08-2021 às 08h18 - Sendo aplicado a quinta demão de impermeabilização na ADM.

**Figura 288**



04-08-2021 às 08h56 - Equipe da serralheria removendo as calhas danificadas.

**Figura 289**



04-08-2021 às 11h21 - Visita da equipe de meio ambiente.

**Figura 290**



04-08-2021 às 12h23 - Status de aplicação de produto de impermeabilização na cobertura ADM.

**Figura 291**



04-08-2021 às 15h23 - Sendo retirado a caçamba 73.

**Figura 292**



04-08-2021 às 15h53 - Sendo entregue 10 telhas para duas proprietárias da cobertura do trailer vermelho.

**Figura 293**



04-08-2021 às 16h45 - Sendo retirado a caçamba 74.

**Figura 294**



04-08-2021 às 17h29 - Status de instalação da iluminação na ADM.

**Figura 295**



05-08-2021 às 07h12 - Linha de produção de calhas para o telhado.

**Figura 296**



05-08-2021 às 07h12 - Sendo retirado o fechamento de lata na rua Acre.

**Figura 297**



05-08-2021 às 07h12 - VT com equipe da equatorial na subestação.

**Figura 298**



05-08-2021 às 08h21 - Sendo retirado a caçamba 75.

**Figura 299**



05-08-2021 às 11h01 - Sendo passado cabos de elétrica.

**Figura 300**



06-08-2021 às 07h30 - Entrada pela Marechal já com a posição das cancelas.

**Figura 301**



06-08-2021 às 07h30 - Entrada pela Marechal já com a posição das cancelas.

**Figura 302**



06-08-2021 às 07h31 - Postes na frontal já remanejados o que estavam a mais.

**Figura 303**



06-08-2021 às 09h15 - Status da calçada no estacionamento principal.

**Figura 304**



06-08-2021 às 11h02 - Status de instalação das cercas pelo lado do fórum.

**Figura 305**



06-08-2021 às 11h03 - status de pintura na área externa.

**Figura 306**



06-08-2021 às 14h02 - Status de limpeza das caixas d'água.

**Figura 307**




06-08-2021 às 15h43 - Entrada pelo fórum.

**Figura 308**



07-08-2021 às 08h42 - Empresa Equatorial energia, troca de medidor de monofásico para trifásico.

**Figura 309**

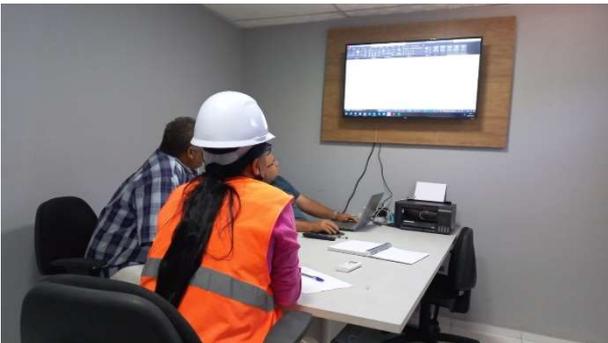

09-08-2021 às 07h55 - Primeira reunião na sala ADM para alinhamento cronograma de obras da semana.

**Figura 310**



09-08-2021 às 08h27 - Sendo retirado as caçambas 78 e 79.

**Figura 311**



11-08-2021 às 08h16 - Status de reparos das calhas no telhado do restaurante.

**Figura 312**



11-08-2021 às 08h31 - Status de instalação das cercas belgo e limpeza no estacionamento 3.

**Figura 313**



11-08-2021 às 08h49 - Status de instalação dos bloquetes.

**Figura 314**



12-08-2021 às 12h17 - Status dos trabalhos do serralheiro nas calhas.

**Figura 315**



13-08-2021 às 16h25 - Pintura ADM - 67mtrs.

**Figura 316**



13-08-2021 às 16h32 - Pintura frente pavilhão estacionamento 03 - 178mtrs.

**Figura 317**



13-08-2021 as 17h49 - Sendo retirado a caçamba 80.

**Figura 318**



14-08-2021 às 09h21 - Equipe em atividade nas calçadas.

**Figura 319**



14-08-2021 às 16h23 - Equipe de pintura do painel frente pavilhão em atividade.

**Figura 320**



14-08-2021 às 16h24 - Instalando comunicação visual de uso obrigatório em EPI na obra.

**Figura 321**



16-08-2021 às 08h04 - Status de limpeza no Hall nobre.

**Figura 322**



16-08-2021 às 08h20 -Trabalhos de alvenaria no palco segue em andamento.

**Figura 323**



16-08-2021 às 08h26 - Status dos trabalhos de serralheiro nas calhas e no telhado

**Figura 324**



16-08-2021 às 08h37 - Sendo feito limpeza nas caixas de água no Telhado que sustenta o centro de convenções.

**Figura 325**



16-08-2021 às 08h42 - Segue em andamento a instalação da cerca belgo.

**Figura 326**



16-08-2021 às 10h58 - Caixas água antes de ser efetuado a limpeza.

**Figura 327**



16-08-2021 às 11h53 - Segue instalação e vedação das calhas nas janelas frente marquise estacionamento 03.

**Figura 328**



16-08-2021 às 14h07 - Status de revitalização do painel.

**Figura 329**



16-08-2021 às 14h55 - Status de instalação de drywall parede.

**Figura 330**



16-08-2021 às 16h17 - Fechando grades lado Fórum.

**Figura 331**



17-08-2021 às 08h05 - Piso sendo tratado.

**Figura 332**



17-08-2021 às 10h03 - Segue Limpeza e Tratamento Piso na área do Restaurante.

**Figura 333**



17-08-2021 às 10h38 - nesta presente data estamos sem atividade de revitalização no painel até este presente horário.

**Figura 334**



17-08-2021 às 15h57 - Sr.Nonato acompanhando artistas na revitalização painel

**Figura 335**



17-08-2021 às 17h17 - Status dos trabalhos de revitalização do painel.

**Figura 336**



18-08-2021 às 09h22 - Status de trabalho de serralheiro nas calhas.

**Figura 337**



18-08-2021 às 09h48 - Portão temporário da entrada do estacionamento 3.

**Figura 338**



18-08-2021 às 09h53 -Instalação de Drywall no Teatro em andamento.

**Figura 339**



18-08-2021 às 10h13 - Status do reboco na área externa do estacionamento do restaurante.

**Figura 340**



18-08-2021 às 16h00 - Trabalhos de serralheria segue em andamento.

**Figura 341**



18-08-2021 às 16h37 - Sendo retirado a caçamba 81.

**Figura 342**



19-08-2021 às 10h50 - Status de pintura do palco.

**Figura 343**



19-08-2021 às 11h35 - Status de trabalhos de serralheiro nas calhas.

**Figura 344**



20-08-2021 às 09h14 - Revitalização do painel em andamento.

**Figura 345**



20-08-2021 às 14h23 - Status Limpeza e retirada de entulho no estacionamento 3.

**Figura 346**



20-08-2021 às 16h56 - Sendo retirado a caçamba 82.

**Figura 347**



21-08\_2021 às 08h26 - Status de pintura da marquise em andamento.

**Figura 348**



21-08-2021 às 14h49 - Status de desmontagem dos quiosques das irmãs.

**Figura 349**



21-08-2021 às 14h55 - Área do quiosque 01 já demolido e limpa, pronta pra receber os bloquetes.

**Figura 351**



22-08-2021 às 09h24 - Área nova quiosque dona Joana sem movimentação de trabalhos desde 21-08 as 08h40.

**Figura 353**



22-08-2021 às 11h16 - Quiosque 2 desmontado e feita desmobilização pra fora centro convenções, preparando área para receber os bloquetes.

**Figura 350**



22-08-2021 às 03h00 – Às 03horas da manhã o vento derrubou partes da árvore da frente do pavilhão, sem danos nas vidraças (providenciaremos recolhimento).

**Figura 352**



22-08-2021 as 10h17 - Descarregando material, trailer da dona Joana na área direcionada por ela.

**Figura 354**



22-08-2021 às 17h40 -Status de revitalização do painel.

**Figura 355**



23-08-2021 às 08h22 - Sendo retirado as caçambas 83 e 84.

**Figura 356**



23-08-2021 às 08h26 - Dando início aos banheiros no Pavilhão 1.

**Figura 357**



23-08-2021 às 09h10 - Status de serralheria no telhado.

**Figura 358**



23-08-2021 às 10h35 - Status aplicação de drywall no teatro.

**Figura 359**



23-08-2021 às 10h38 - Limpando área livre do antigo quiosque.

**Figura 360**



23-08-2021 às 12h50 - Status de limpeza na área do antigo quiosque das irmãs.

**Figura 361**



23-08-2021 às 14h38 - Status de instalação dos bloquetes.

**Figura 362**



23-08-2021 às 14h46 - Status de revitalização do painel.

**Figura 363**



23-08-2021 às 15h21 - Posicionando luminárias no estacionamento.

**Figura 364**



23-08-2021 às 15h52 - Preparação da área do antigo quiosque dona Joana.

**Figura 365**



24-08-2021 às 17h12 - Status revitalização do painel.

**Figura 366**



25-08-2021 às 10h32 - Revitalização do painel segue em andamento.

**Figura 367**



25-08-2021 às 11h09 - Isolamento de dutos do ar condicionado no restaurante em andamento.

**Figura 368**



25-08-2021 às 11h12 - Pintura externa do restaurante em andamento.

**Figura 369**



25-08-2021 às 15h44 - Segue sendo instalado as luminárias do pátio.

**Figura 370**



25-08-2021 às 17h12 - Status de revitalização do painel.

**Figura 371**



26-08-2021 às 08h38 - Segue visita do governador nas dependências do CCT.

**Figura 372**



26-08-2021 às 10h29 - Segue em andamento a pintura do palco.

**Figura 373**



26-08-2021 às 15h29 - Finalizando a instalação dos bloquetes na área do antigo quiosque da Sra. Joana.

**Figura 374**



26-08-2021 às 15h51 - Segue instalação do sistema de ar condicionado do auditório.

**Figura 375**



26-08-2021 às 15h53 - Status da revitalização do painel.

**Figura 376**



26-08-2021 às 17h17 - Segue instalação das luminárias no estacionamento restaurante.

**Figura 377**



26-08-2021 às 17h39 - Instalação do sistema de ar condicionado do auditório em andamento.

**Figura 378**



27-08-2021 às 08h12- Instalação dos bloquetes no estacionamento 4 em andamento.

**Figura 379**



27-08-2021 às 08h15 - Instalação hidráulica do estacionamento 4 em andamento.

**Figura 380**



27-08-2021 às 09h03 - Alvenaria do salão nobre em andamento.

**Figura 381**



27-08-2021 às 09h16 - Segue em andamento pintura do palco.

**Figura 382**



29-08-2021 às 18h11 - Iluminação do estacionamento 1 acesa.

**Figura 383**



30-08-2021 às 13h43 - Instalação dos pisos bloquetes do estacionamento 4 em andamento

**Figura 384**



31-08-2021 às 08h45 - Status de instalação de drywall no teatro.

**Figura 385**



31-08-2021 às 09h01 - Status de serviços nas calhas, na área do restaurante.

**Figura 386**



31-08-2021 às 10h24 - Sendo retirado a plataforma elevatória articulada da obra.

**Figura 387**



31-08-2021 às 10h35 - Status de serviço de alvenaria na escada do Hall do auditório.

**Figura 388**



01-09-2021 às 17h21 - Status de aplicação de gesso no teatro.

**Figura 389**



02-09-2021 às 10h38 - Status de instalação dos drenos de ar condicionado auditórios.

**Figura 390**



02-09-2021 às 10h59 - Status Hall nobre, sendo aplicado massa e lixado as paredes.

**Figura 391**



02-09-2021 às 16h10 - Status de instalação das calhas área restaurante.

**Figura 392**



03-09-2021 às 09h15 - Status de instalação de drywall no teatro.

**Figura 393**



03-09-2021 às 09h21 - Status de instalação elétrica do restaurante.

**Figura 394**



04-09-2021 às 09h12 - Medição elétrica no salão Nobre em andamento.

**Figura 395**



04-09-2021 às 09h33 - Equipe de serralheria fazendo vedação dos vidros.

**Figura 396**



06-09-2021 às 09h41- Status de demolição no Pavilhão inferior entrada de acesso.

**Figura 397**



06-09-2021 às 09h43 - Segue em andamento trabalhos de alvenaria nos banheiros do Pavilhão inferior.

**Figura 398**



07-09-2021 as 11h19 - Portão Cercamento estacionamento 3 instalado.

**Figura 399**



08-09-2021 às 09h00 - Instalação elétrica no salão nobre em andamento.

**Figura 400**



08-09-2021 às 09h08. - Segue e andamento instalação de Drywall no teatro.

**Figura 401**



08-09-2021 às 14h46 - Gesso mineral do Teatro retirado e armazenado.

**Figura 402**



10-09-2021 às 13h33 - Segue em andamento trabalho de alvenaria nos banheiros do piso inferior.

**Figura 403**



11-09-2001 às 13h59 - Status de trabalhos na calçada.

**Figura 404**



11-09-2021 às 08h54 - Segue em andamento instalação de drywall no teatro.

**Figura 405**




11-09-2021 às 10h22 - Concluído 99% da instalação de drywall, parede do teatro.

**Figura 406**



11-09-2021 às 10h27 - Finalizando a retirada dos forros no hall do teatro.

**Figura 407**

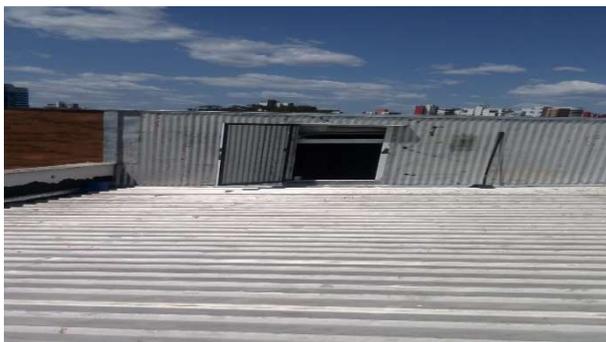

11-09-2021 às 13h33 - Finalizada casinha do telhado.

**Figura 408**



11-09-2021 às 13h55 - Sendo feito as tampas dos postes que ficam próximo a cerca.

**Figura 409**



11-09-2021 às 13h59 - Status de trabalhos na calçada.

**Figura 410**



11-09-2021 às 17h15 - Sendo retirado a caçamba 87.

**Figura 411**



16-09-2021 às 08h35 - Status elétrica iluminação externa em andamento.

**Figura 412**



20-09-2021 às 10h05 - Sendo feito passagem de tubulação hidráulica no salão nobre.

**Figura 413**



21-09-2021 às 09h05 - Instalação do sistema de ar condicionado do Restaurante em andamento.

**Figura 414**



21-09-2021 às 09h15 - Pintura das paredes do teatro em andamento.

**Figura 415**



21-09-2021 às 15h00 - Reboco da parede do banheiro no Pavilhão em andamento.

**Figura 416**



24-09-2021 às 14h00 - Contrapiso da marquise em andamento.

**Figura 417**



27-09-2021 às 11h51- status teatro elétrica, verificando passagem de cabeamento.

**Figura 418**



27-09-2021 às 14h46 - Acesso de Exaustor liberado no vidro do restaurante.

**Figura 419**



27-09-2021 às 17h57 - Descupinização no Auditórios em andamento.

**Figura 420**



27-09-2021 às 18h00 status descupinização auditórios em andamento.

**Figura 421**



28-09-2021 às 16h05 - Pintura das paredes do teatro em andamento.

**Figura 422**



28-09-2021 às 16h10 - Fechamento do depósito no Pavilhão inferior em andamento.

**Figura 423**



28-09-2022 às 16h15 - Contrapiso da marquise em andamento.

**Figura 424**



30-09-2021 às 10h55 - Pintura do pavilhão inferior em andamento.

## 1.7. AÇÕES SOCIAIS

### PROJETO SOCIAL “VALE DO GAVIÃO”

Em uma região marcada pela violência, criminalidade e injustiças sociais, um projeto social inspirador apoia jovens através da música. Sob a liderança do professor e maestro Melquezedeuque Gabriel Fideles, 20 jovens da comunidade se reúnem todos os sábados para ter aulas de música. Com o apoio da comunidade, um espaço cedido pela Associação de Moradores do bairro é utilizado para as aulas. Entretanto, o local carecia de manutenção e adequações para oferecer as condições básicas de uso, tais como sanitários. O Centro de Convenções de Teresina vem apoiando esta causa que leva cultura e esperança para estes jovens. O espaço está passando por reformas, os alunos ganharão uniformes e todos os materiais necessários para o desenvolvimento e aprendizado. O objetivo é que, em breve, a Banda Vale do Gavião possa se apresentar no Teatro do Novo Centro de Convenções e acabe por incentivar que outros jovens também façam parte desta iniciativa.

Neste sentido, no dia 11 de Setembro 2021 o Centro de Convenções de Teresina deu início à reforma do espaço de encontro da Associação dos Moradores da Comunidade do VALE DO GAVIÃO, inclusive em consonância com a cláusula 8.10 do Contrato.

Os trabalhos de reforma visam melhorar o espaço para atender melhor a comunidade do entorno. Iniciou-se, assim, os trabalhos de reforma, retirada de entulhos, construção de calçadas e salas de apoio, melhorias na área externa, construções de banheiros e novas instalações elétricas e hidráulicas.

Abaixo, seguem algumas fotos dos trabalhos que estão sendo realizados no local.







**SPE CENTRO DE CONVENÇÕES DE TERESINA S/A.**
