



RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS

TERMINAL RODOVIÁRIO DE TERESINA

REFORMA E MODERNIZAÇÃO

ABR/2017



Relatório de Acompanhamento

Setor	Serviços executados
Instalação do elevador	Concluído o serviço de locação, escavação, ferragem e concretagem do piso e das paredes do poço do elevador.
Restaurantes Pav. Superior	Concluído os serviços de locação, execução de alvenaria, chapisco e reboco.
Sanitário masc./fem. Pavimento Térreo.	Concluído os serviços de demolições, remoção de entulho, alvenaria, chapisco e reboco. Iniciado os serviços de cortes para instalações hidráulicas e regularização de paredes para impermeabilização.
Sanitário masc. Pav. Superior.	Reiniciado serviço de alvenaria, chapisco e reboco do sanitário após desocupação de área antes ocupadas por permissionários.

Variedades Pav. Superior	Desocupada área antes ocupada por permissionários possibilitando o reinício da obra. Reiniciado os serviços de alvenaria, chapisco e reboco da área.
Reservatório Elevado	Iniciado os serviços de locação e escavação para execução do projeto da base do reservatório elevado.
Estacionamento	Em fase de conclusão os serviços de reforma da área do estacionamento e instalação do gradil para isolamento da área.
Rampas de Acesso	Em fase de conclusão os serviços de instalação dos corrimãos de inox das rampas de acesso do terminal.
Impermeabilização	Iniciado o serviço de remoção e reposição de impermeabilização de pétalas do teto do terminal rodoviário.
Reforma do Subsolo	Concluída obra de construção da área institucional no subsolo do terminal.



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

OBRA: Ref. e modernização do terminal rodoviário de Teresina

SERVIÇOS EXECUTADOS



Instalação do elevador.



Restaurante Pav. Superior.






Sanitário Pav. Térreo.



Variedades Pav. Superior.




Estacionamento.

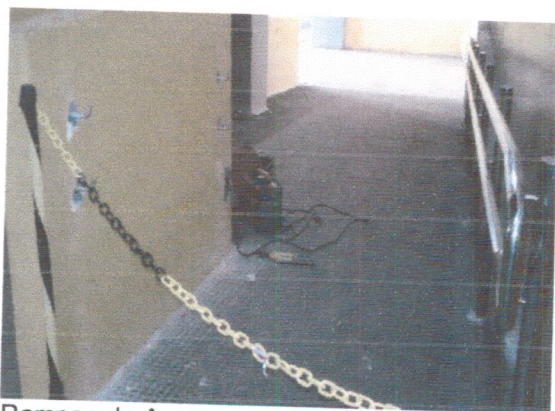


Rampas de Acesso.



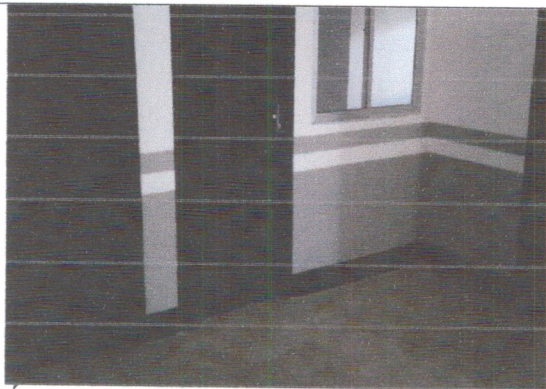

Área Institucional.

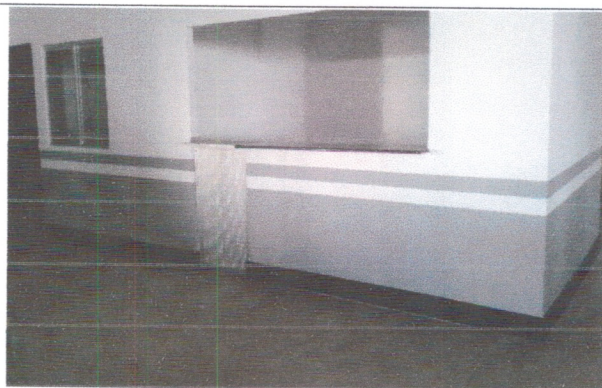

Sanitário Pav. Superior.



Impermeabilização pétalas do teto.



Celso Costa
 Coord. de Manutenção/SINART-PI
 Terminal Rod. Teresina
 (86) 9.9962-4695 watts
 (86) 9.9962-4695
