RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO

DAS

OBRAS

TERMINAL RODOVIÁRIO DE TERESINA

REFORMA E MODERNIZAÇÃO

MAR/2017

SINART
ISO - 9001

Relatório de Acompanhamento

Setor	Serviços executados
Instalação do elevador	Concluído o serviço de escavação do poço do elevador e iniciado a locação para início dos serviços de concretagem do fundo do poço e das paredes laterais.
Restaurantes Pav. Superior	Concluído os serviços de demolições de alvenaria, piso, forro e vigas de concretos e iniciado os serviços de alvenaria, chapisco e reboco.
Sanitário masc./ fem. Pavimento Térreo.	Iniciado os serviços de reforma do sanitário do pavimento térreo, concluído serviços de demolições e iniciado os serviços de alvenaria, chapisco e reboco.
Variedades Pav. Superior	Iniciado os serviços de alvenaria, chapisco e reboco da área.

Reservatório Elevado	Concluída elaboração do projeto da base do reservatório, contratada empresa para execução da mesma e posterior instalação do reservatório elevado.
Estacionamento	Iniciado os serviços de reforma da área do estacionamento e instalação do gradil para isolamento da área.
Rampas de Acesso	Iniciado o serviço de instalação dos corrimãos de inox das rampas de acesso do terminal.
Reforma do Subsolo	Em fase de conclusão os serviços de construção da área institucional do Terminal rodoviário.

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

OBRA: Ref. e modernização do terminal rodoviário de Teresina

SERVIÇOS EXECUTADOS

Instalação do elevador.

Restaurante Pav. Superior.

Sanitário Pav. Térreo.

Variedades Pav. Superior.

Estacionamento.

Rampas de Acesso.

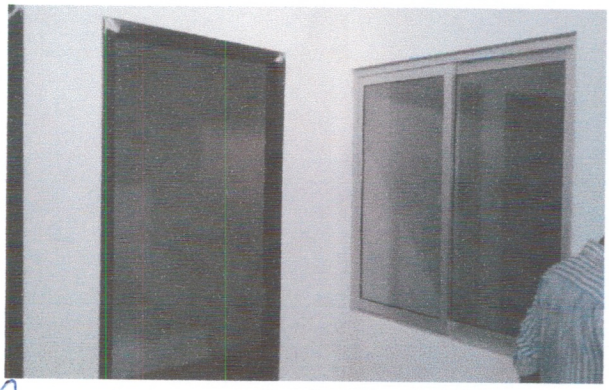

Área Institucional.

Celso Costa
Coord. de Manutenção/SINART-PI
Terminal Rod. Teresina
(86) 9.9962-4695 watts
(86) 9.9962-4695

Celso Sousa
Coordenador de Manutenção
SINART - RODOVIÁRIAS
