



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO

PROJETO PIAUÍ CONECTADO

1. Apresentação

O presente documento trata-se de um Relatório de Atividades executadas pela SPE PIAUÍ CONECTADO durante o mês de setembro e outubro de 2019. O referido relatório atende as determinações do Manual de Gestão de Contratos de Concessões e Parcerias Público Privadas do Estado do Piauí, com a finalidade de fornecer informações para o Comitê de Monitoramento e Gestão sobre as atividades executadas e atendimento das obrigações estipuladas no contrato de PPP nº 01/2018.

2. Licenciamento Ambiental

Licenciamento Backbone

Para procedimento de licenciamento ambiental do projeto, protocolou-se Consulta Prévia junto à Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Piauí – SEMAR, através do processo nº AA.130.1006635/19. O órgão se manifestou com a indicação de que a licença a ser solicitada deverá ser uma Declaração de Baixo Impacto Ambiental – DBIA, por se tratar de uma intervenção com baixo grau de impacto ambiental e grande abrangência social. Para a instrução processual de DBIA, foi indicado um Relatório Ambiental Simplificado para a descrição dos possíveis impactos ambientais, sua magnitude, bem como as medidas de gerenciamento e prevenção às alterações adversas da qualidade ambiental na área de intervenção e entorno. Diante disso, contratou-se Consultoria Ambiental para elaboração do referido estudo. Em 29 de outubro foi protocolado o processo junto a SEMAR, gerando o processo nº AA.130.1.008399/19. O processo encontra-se em análise naquele órgão.



À
SEMAR – Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Estado do Piauí.

At.: Ilma Sra. Sádya Castro,
Secretária - SEMAR

SPE PIAUÍ CONECTADO - OF. 079 /2019

Referência: Contrato nº 01/2018 – Construção, Operação e Manutenção de Infraestrutura de Transporte de Dados, Voz e Imagem, incluindo Serviços Associados para o Governo do Estado do Piauí ("PROJETO PIAUÍ CONECTADO").

Assunto: Solicitação de DBIA.

Prezada Senhora,

A SPE PIAUÍ CONECTADO S/A, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 30.412.491/0001-49, com sede à Avenida Alencar de Matos, nº 4855, bairro Brasil, Teresina -PI CEP. 64.000-710, neste ato por seu Diretor Presidente, Sr. Emerson Thiago da Silva, vem a presença de V.Sa., solicitar que autorize a Superintendência de Meio Ambiente dessa Secretaria a apreciar e analisar o pedido de Declaração de Baixo Impacto Ambiental para a construção, operação e manutenção de infraestrutura de transporte de dados, voz e imagem – Projeto Piauí Conectado.

Nestes termos, peço deferimento.

Teresina, 22 de outubro de 2019

AA-130.1.006399/19
Sessão: 07/30/19

PROTÓCOLO GERAL
Sec. Meio Amb. Rec. Hídricos
RECEBIDO
Em 22/10/2019 às 14:00 hs.
Sadya Castro
Secretária

Atenciosamente,



SPE PIAUÍ CONECTADO S/A
Emerson Thiago da Silva
Diretor Presidente
emerson@piauiconectado.com.br
Avenida Alencar Matos, nº 4.855, Bairro Brasil
Teresina - Piauí - CEP: 64.035-482
CNPJ: 30.412.491/0001-49
contato@piauiconectado.com.br

Licenciamento Ambiental Teresina

Após tratativas com o Órgão ambiental do município de Teresina, o Secretário Executivo fez a orientação para que o Licenciamento Ambiental de implantação e ativação de pontos no município fosse solicitado à Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Foi dada entrada no Processo SEMAM nº 037.02064/2019 solicitando a indicação do tipo de licença deveríamos solicitar e qual o estudo ambiental deverá ser adotado. O órgão ambiental se manifestou para o pedido de licenciamento simplificado em 03 de outubro de 2019.

3. Termos, Autorizações e Certidão de Uso e Ocupação do Solo

a. Certidão de Uso e Ocupação do Solo

De acordo com o que estabelece a Resolução Conama nº 237, de 1997, no § 1º do art. 10 deve constar no processo de licenciamento ambiental, a certidão do município atestando que o local e o tipo de empreendimento ou atividade estão em conformidade com as leis, que preveem as peculiaridades e especificidades locais. Em atendimento à referida Resolução, a Concessionária vem solicitando as Certidões

junto aos municípios. Até o presente, foram emitidas as certidões dos seguintes municípios: Agricolândia, água Branca, Alto Longá, Altos, Alvorada do Gurguéia, Angical do Piauí, Barras, Bertolândia, Brasileira, Brejo do Piauí, Campo Maior, Capitão de Campos, Cocal de Telha, Colônia do Piauí, Coronel José Dias, Corrente, Demerval Lobão, Elesbão Veloso, Eliseu Martins, Hugo Napoleão, Ilha Grande, Inhumas, Ipiranga, José de Freitas, Lagoinha do Piauí, Landri Sales, Monsenhor Gil, Morro do Chapéu, Nazária, Nova Santa Rita, Oeiras, Palmeirais, Parnaíba, Patos do Piauí, Paulistana, Piracuruca, Piripiri, Regeneração, Rio Grande do Piauí, Santo Inácio, São Gonçalo do Piauí, São José do Piauí, São Raimundo Nonato, Tamboril, Joaquim Pires, União e Várzea Grande.

b. Termos de Autorização

Para a implantação da fibra óptica nos municípios, a Concessionária solicita Termo de Autorização aos Gestores Municipais, que autoriza a Concessionária a execução dos serviços necessários para o lançamento de cabeamento e tubulações do projeto no município, atendendo todas as legislações vigentes nas esferas municipais, estaduais e federal.

Até o presente, a SPE Piauí Conectado possui autorização dos seguintes municípios: Agricolândia, Altos, Alto Longá, Água Branca, Alvorada do Gurgueia, Barras, Bertolândia, Brasileira, Brejo do Piauí, Campo Maior, Capitão de Campos, Cocal de Telha, Coivaras, Colônia do Piauí, Coronel José Dias, Corrente, Demerval Lobão, Elesbão Veloso, Eliseu Martins, Hugo Napoleão, Ilha Grande, Inhumas, Ipiranga, Joaquim Pires, José de Freitas, Lagoinha, Landri Sales, Luís Correia, Manoel Emídio, Monsenhor Gil, Morro do Chapéu, Nazaria, Nova Santa Rita, Oeiras, Palmeirais, Patos, Paulistana, Piracuruca, Piripiri, Regeneração, Santo Inácio, São José do Piauí, São Pedro, São Raimundo Nonato, Tamboril e União..

c. Termo de Autorização DNIT

A SPE Piauí Conectado solicitou ao DNIT análise do projeto de implantação do Backbone, instalação ou substituição de postes, travessia de vias através de MND ou lançamento de tubulação e cabeamento óptico nas faixas de domínio através de métodos destrutivos. Diante da extensão do projeto e para facilitar a análise por parte

do DNIT, solicitou-se, inicialmente, a autorização para o primeiro trecho da BR 343, referente ao trecho de Teresina a Campo Maior.

Após análise, a referida autorização foi emitida, juntamente com o Termo de Compromisso em 16 de setembro de 2019 em reunião realizada na Superintendência Regional do DNIT, conforme registro fotográfico abaixo:



Após o recebimento da autorização referente ao primeiro trecho do backbone nas rodovias federais, protocolou-se em 11 de outubro, a solicitação de autorização do segundo trecho, que corresponde ao trecho: Campo Maior (km 188) a Piripiri (km 263), gerando o processo nº 50618.001371/19-47.


d) CEPISA EQUATORIAL

Atualmente projetos aprovados na CEPISA de 63 municípios, totalizando 111 projetos e 574,415 km. Ao mesmo tempo, encontram-se em análise por parte da concessionária de energia elétrica, 25 projetos de 25 municípios, totalizando 93,8 km protocolados naquele órgão.


Dos municípios contemplados no Projeto Piauí Conectado, temos a seguinte situação:

98 MUNICÍPIOS	
APROVADOS	64,29%
ANÁLISE CEPISA	23,47%
EM ANDAMENTO	12,24%

DOS 98 MUNICÍPIOS PARA CONFEÇÃO DOS PROJETOS CEPISA

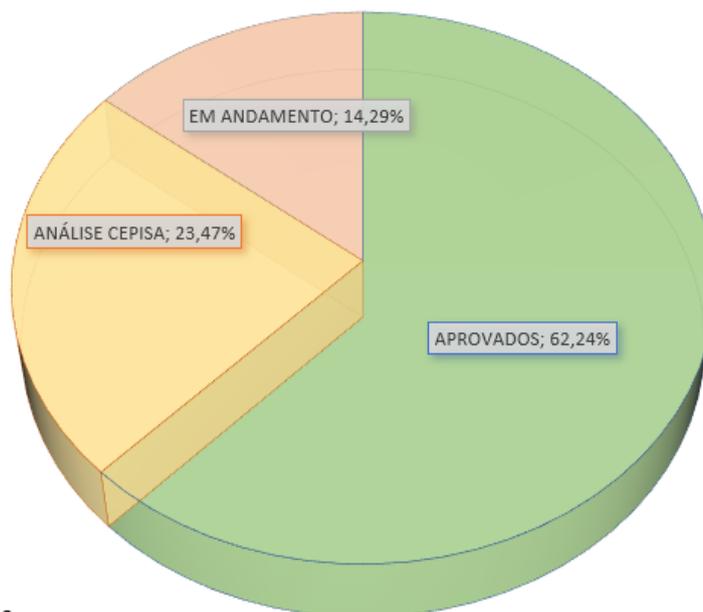



ATUALIZADO EM 28/10/2019

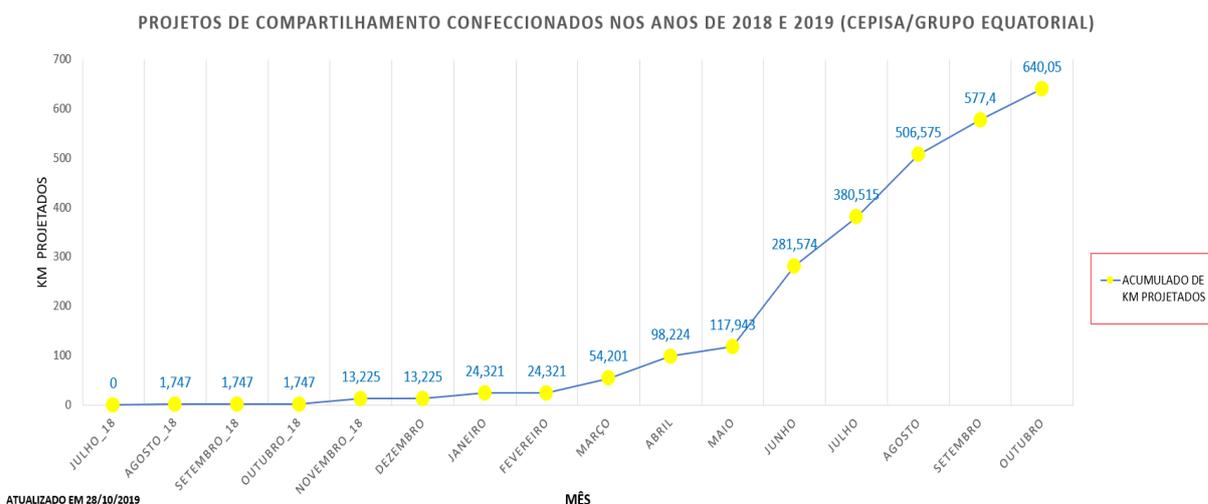

4. Implantação de Fibra Óptica

Para transportar o sinal ótico desde a OLT até o Ponto de Acesso do Governo, foram lançados cabos ópticos, atendendo, até o momento, as seguintes cidades: Teresina, Campo Maior, Altos, Parnaíba, Luís Correia, Buriti dos Lopes, Ilha Grande e Piri-piri, conforme registro fotográfico a a seguir:

Encontram-se em execução atualmente, os municípios de José de Freitas, União, Barras, Piracuruca, Cocal, Esperantina, Luzilândia, Oeiras, Floriano, Picos e Amarante.

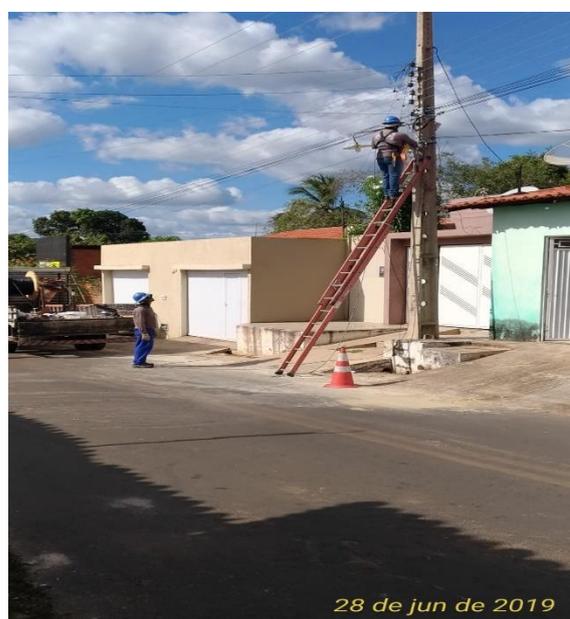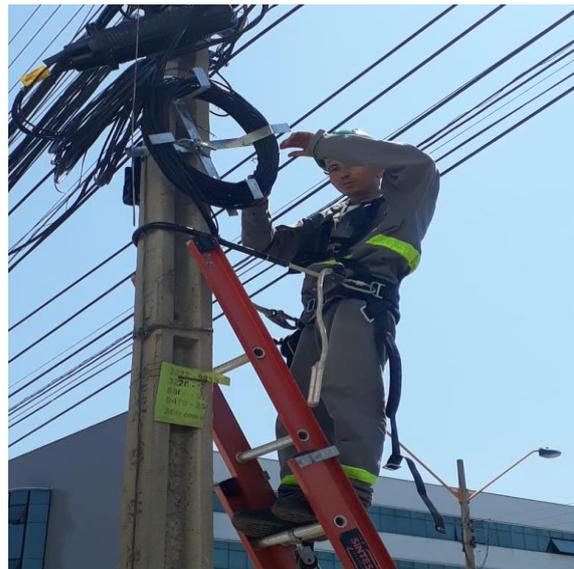

5. Ativação de Links

Durante os meses de setembro e outubro, foram ativados 224 pontos PAG (Pontos de Acesso do Governo) das OLTs 01, 02 e 03, acumulando 512 pontos ativados, conforme gráfico a seguir:



ATUALIZADO EM 07/11/2019

6. Investimento

Para a implantação e operação do projeto Piauí Conectado, foram investidos o valor de R\$ 21.205.953,37 (Vinte um milhões, duzentos e cinco mil e novecentos e cinquenta e três reais e trinta e sete centavos), com o detalhamento a seguir:

DESCRIÇÃO	VALOR R\$
Projeto Executivo	6.954.547,43
Lançamento de Fibra GPON	1.393.535,00
Ativos GPON	4.549.467,66
Modelagem do Projeto	2.942.305,00
Despesas Administrativas	5.366.098,28

7. Programa de Seguros

Como forma de atendimento ao Contrato de PPP nº 01/2018 clausula 28, a SPE Piauí Conectado assinou apólices de seguro patrimonial e de equipamentos com as seguintes coberturas:

- ✓ Incêndio e complementares;
- ✓ Danos elétricos;
- ✓ Despesas fixas;

- ✓ Responsabilidade Civil;
- ✓ Avarias de máquinas; e
- ✓ Roubo.

8. Geração de Empregos

Atualmente a Empresa SPE Piauí Conectado possui 80 colaboradores do Projeto Piauí Conectado, sendo 17 funcionários no setor administrativo, 28 funcionários da Equipe de Campo e 35 terceirizados.

9. Treinamentos

Curso Gerenciamento de Projetos

Através de provocação pela Controladora Geral do Estado, a SPE ministrou curso de Gerenciamento de Projetos, que visa propiciar que as áreas de TIC (comercial, serviços e de projetos), conheçam todas as terminologias e as melhores práticas de gerenciamento de projetos, aprimorando a elaboração, planejamento, execução, controle e encerramento dos projetos com sucesso. O público alvo foi técnicos Analistas da CGE e colaboradores que atuam na gestão de projetos em diversos órgãos da Administração Pública Estadual.

O referido curso teve carga horária de 24 horas dividido em cinco horas/aula e foi ministrado pelo Professor Antônio João de Arruda Cebalho, que é Engenheiro Eletricista/Eletrônico/Telecomunicações – ITA Tecnológico da Aeronáutica, Especialista em Gerenciamento de Serviços de TI-TIL V3, COBIT, entre outros. Os participantes receberam certificado emitido pela Empresa Global Task.

Curso
Gestão de Projetos

07/10
A
10/10

13h às 18h
Sala de Treinamento
da CBE
215 Av. Pedro II, 100, São José Paulo,
Centro Administrativo, 2ª andar

Ministrante:
Professor Antônio Cebalho

Vagas limitadas

Público-alvo: Técnicos, Analistas, Colaboradores atuantes ou que desejam atuar na área de Projetos

Conteúdo programático:

- Módulo 01: Introdução à Gestão de Projetos
- Módulo 02: Fundamentos de Processo de Gerenciamento de Projetos
- Módulo 03: Estágios do Ciclo de Vida de um Projeto - Visão Geral
- Módulo 04: Considerações Preliminares sobre Projetos
- Módulo 05: Escopo, Plano de Comunicações e Gerenciamento de Riscos
- Módulo 06: Planejamento do Projeto
- Módulo 07: Montando o Plano de Gerenciamento de um Projeto
- Módulo 08: Execução e Controle do Projeto
- Módulo 09: Encerramento do Projeto

Inscrições gratuitas para servidores do Estado do Piauí



10. Ações Sociais

Cisco Academy

No dia 06 de setembro foi entregue o primeiro certificado do curso de capacitação de Professores, que serão multiplicadores do projeto de inclusão digital promovido pela SPE Piauí Conectado em parceria com a Cisco Academy, destinado á Professores da rede pública estadual que farão parte do Programa Cisco Networking Academy.



Programa Cinema nas Escolas

No intuito de levar lazer, entretenimento e aprendizado para escolas beneficiadas pelos cursos de capacitação da Cisco Academy, realizou-se mais uma edição do Programa Cinema nas Escolas, que aconteceu no dia 25 de setembro do corrente ano, na Unidade Escolar Modestina Bezerra na zona sudeste de Teresina. Participaram da atividade, 11 turmas do Ensino Fundamental e Médio. O filme apresentado foi “O Menino Que Descobriu o Vento”.



Capacitação dos Multiplicadores Cisco Academy

No dia 08 de outubro ocorreu mais uma etapa de capacitação com os Professores Multiplicadores do Projeto Cisco Academy, onde deu prosseguimento ao treinamento e preparação do Professores para iniciar as matrículas dos alunos do referido projeto.



Comemoração Dia das Crianças

A SPE Piauí Conectado proporcionou para as crianças da CMEI Santa Helena um dia das crianças especial com a distribuição de brinquedos, que foram arrecadados juntos aos funcionários da concessionária, além de muitas brincadeiras e um lanche. O objetivo do evento foi facilitar a integração dos funcionários com a população do Bairro Brasil e, principalmente, proporcionar um dia agradável às crianças carentes da região.



Teresina, novembro de 2019.
